




PARTIDA 01: PRELIMINARES												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
1	Limpia, Trazo y Nivelacion del Terreno para estructuras, estableciendo ejes y referencias en superficies menores a 300m2. Incluye: Equipo Necesario, Puenteo, Señalización del Banco y Puntos que se Requieran en la Nivelacion con Pintura, Renivelaciones Necesarias, Limpiezas	M2	A-E	1 - 3	9.15	6.15		56.27		56.27	56.27	

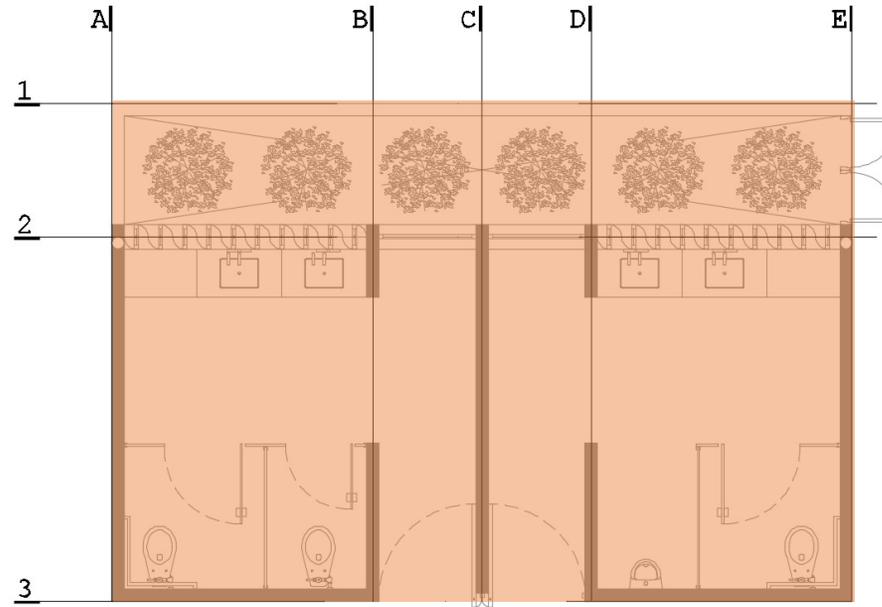


PARTIDA 01: PRELIMINARES												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
2	Despalme de 30cm de espesor a mano material "A", despericiando el material para desplante de teraplens acarreo libre 20m.	M3	A-E	1 - 3	9.15	6.15	0.3	16.88		16.88	16.88	

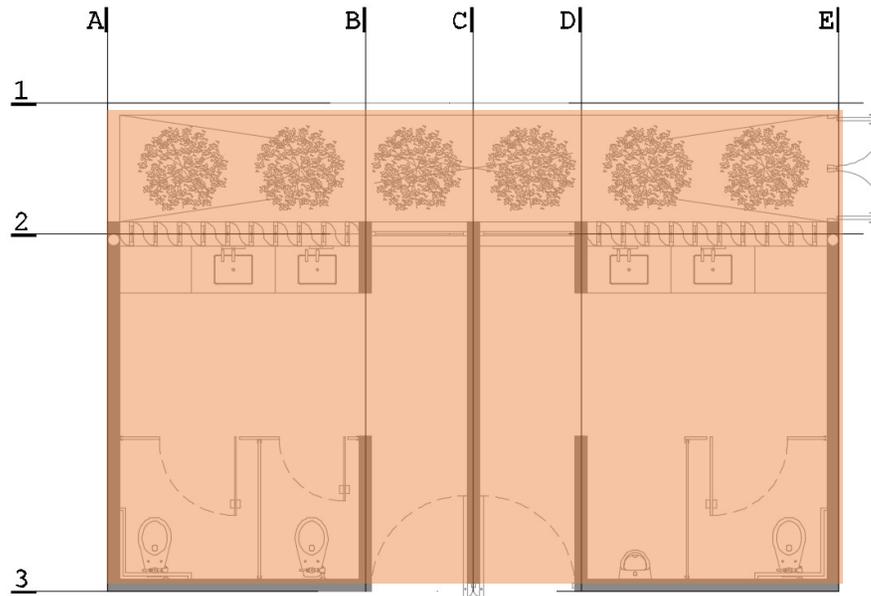


PARTIDA 02: CIMENTACIÓN												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
3	Excavación a mano material tipo "1", zona "A" seco cepas 0 a 2mts. Incluye afloje, extracción, amacice, limpieza de plantilla y taludes, medida de banco.	M3										
3.1		M3	1	A-E	9.15	0.6	1.0	5.49		5.49	29.38	
3.2		M3	2	A-E	9.15	0.6	1.0	5.49		5.49		
3.3		M3	3	A-E	9.15	0.6	1.0	5.49		5.49		
3.4		M3	A	1-3	6.15	0.6	1.0	3.69		3.69		
3.5		M3	B	2-3	2.32	0.6	1.0	1.39		1.39		
3.6		M3	C	2-3	4.575	0.6	1.0	2.75		2.75		
3.7		M3	D	2-3	2.32	0.6	1.0	1.39		1.39		
3.8		M3	E	1-3	6.15	0.6	1.0	3.69		3.69		

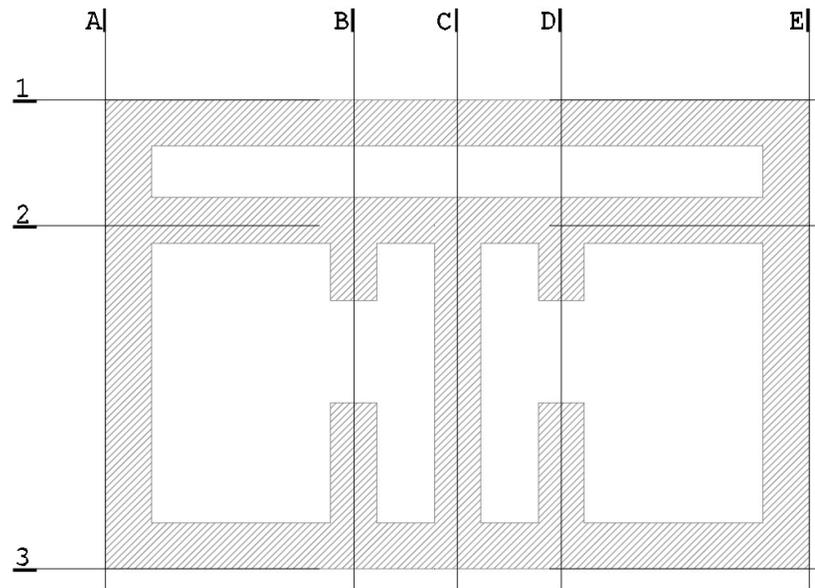


PARTIDA 02: CIMENTACIÓN												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
4	Plantilla de Concreto Hecho En Obra F'c=100kg/cm2 de 5cm de Espesor, Incluye: Materiales, Mano de Obra, Trabajo Terminado	M2										
4.1		M2	1	A-E	9.15	0.6		5.49		5.49	29.38	
4.2		M2	2	A-E	9.15	0.6		5.49		5.49		
4.3		M2	3	A-E	9.15	0.6		5.49		5.49		
4.4		M2	A	1-3	6.15	0.6		3.69		3.69		
4.5		M2	B	2-3	2.32	0.6		1.39		1.39		
4.6		M2	C	2-3	4.575	0.6		2.75		2.75		
4.7		M2	D	2-3	2.32	0.6		1.39		1.39		
4.8		M2	E	1-3	6.15	0.6		3.69		3.69		

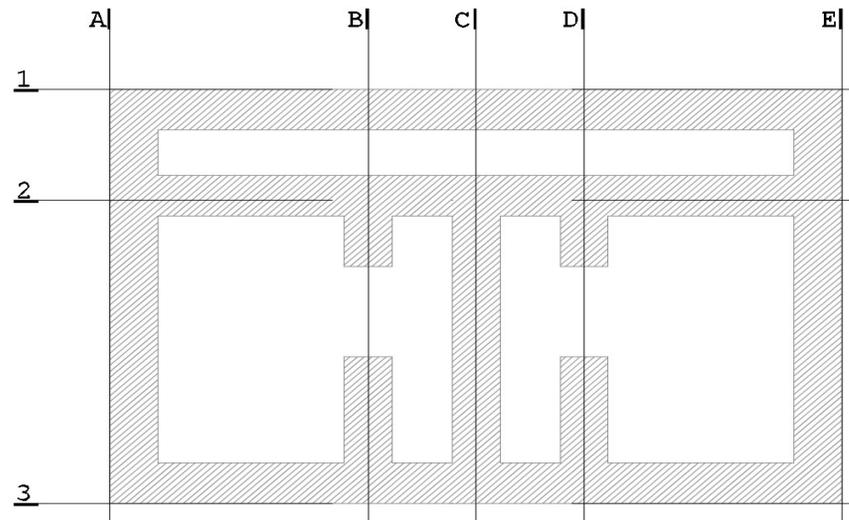


PARTIDA 02: CIMENTACIÓN												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
5	Habilitado, armado y colocación de parrilla de acero para zapata corrida, 5 varillas longitudinales #3 @15cm, varillas transversales de 60cms con ganchos @15cm. Armex reforzado 15x4	KG				*5	*0.557					
5.1		KG	1	A-E	9.15	5	0.557	25.48		25.48	136.37	La cantidad de KG de varilla se obtiene mediante la relación 1Mde varilla#3=0.557KG. Se multiplica *5 puesto que cada ML contiene 5 vs.
5.2		KG	2	A-E	9.15	5	0.557	25.48	25.48			
5.3		KG	3	A-E	9.15	5	0.557	25.48	25.48			
5.4		KG	A	1-3	6.15	5	0.557	17.13	17.13			
5.5		KG	B	2-3	2.32	5	0.557	6.46	6.46			
5.6		KG	C	2-3	4.575	5	0.557	12.74	12.74			
5.7		KG	D	2-3	2.32	5	0.557	6.46	6.46			
5.8		KG	E	1-3	6.15	5	0.557	17.13	17.13			

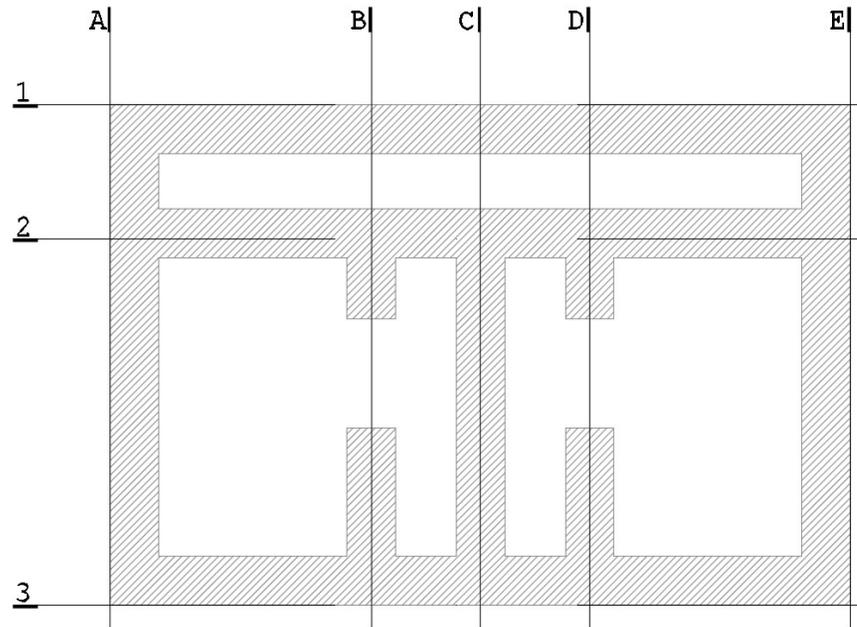


PARTIDA 02: CIMENTACIÓN												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
6	Zapata corrida de 60 x60 cms de ancho y 20 cms de peralte, con , con concreto premezclado f'c=200kg/cm2, reforzada con malla electrosoldada 6x6x10x10. Incluye uso de escantillón y extendido con cuchara.	ML										
6.1		ML	1	A-E	9.15			9.15		9.15	48.97	
6.2		ML	2	A-E	9.15			9.15		9.15		
6.3		ML	3	A-E	9.15			9.15		9.15		
6.4		ML	A	1-3	6.15			6.15		6.15		
6.5		ML	B	2-3	2.32			2.32		2.32		
6.6		ML	C	2-3	4.575			4.58		4.58		
6.7		ML	D	2-3	2.32			2.32		2.32		
6.8		ML	E	1-3	6.15			6.15		6.15		

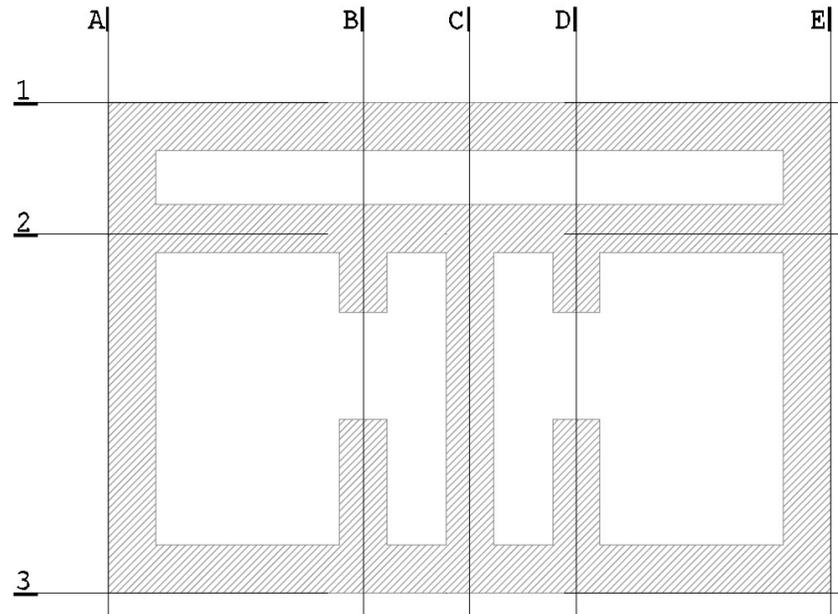


PARTIDA 02: CIMENTACIÓN												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
7	Muro de enrase de cimentación a base de tabicón pesado de 12x20x40, acentado con mortero de cemento-arena 1:3, plomeado y nivelado	M2										
7.1		M2	1	A-E	9.15		1.4	12.81		12.81	69.20	
7.2		M2	2	A-E	9.15		1.4	12.81		12.81		
7.3		M2	3	A-E	9.15		1.4	12.81		12.81		
7.4		M2	A	1-3	6.15		1.4	8.61		8.61		
7.5		M2	B	2-3	2.55		1.4	3.57		3.57		
7.6		M2	C	2-3	4.575		1.4	6.41		6.41		
7.7		M2	D	2-3	2.55		1.4	3.57		3.57		
7.8		M2	E	1-3	6.15		1.4	8.61		8.61		

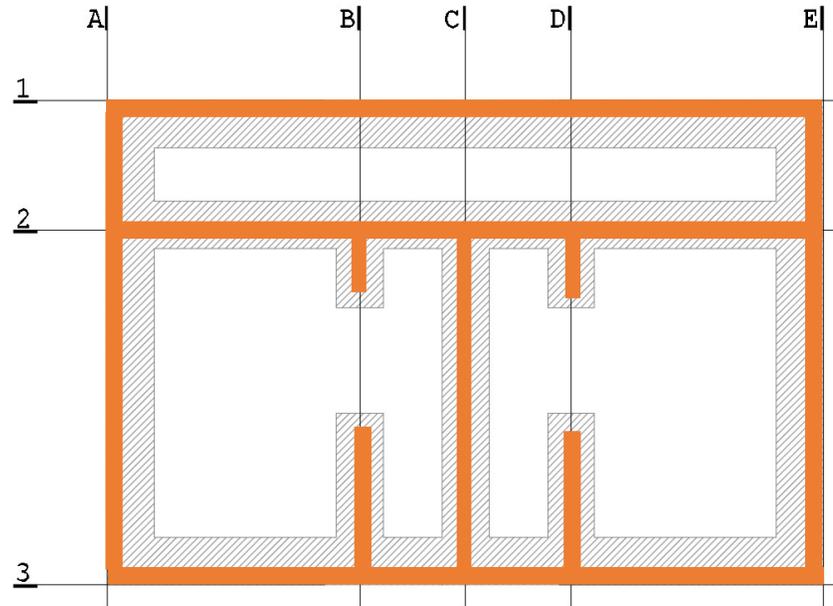


PARTIDA 02: CIMENTACIÓN												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
8	Impermeabilización en desplante de muros hasta 12 cm de espesor, a base de 2 capas de imperfect-e o similar, con membrana de refuerzo de polietileno 800 o similar de 0.2 mm de espesor.	ML										
8.1		ML	1	A-E	9.15			9.15		9.15	49.43	
8.2		ML	2	A-E	9.15			9.15		9.15		
8.3		ML	3	A-E	9.15			9.15		9.15		
8.4		ML	A	1-3	6.15			6.15		6.15		
8.5		ML	B	2-3	2.55			2.55		2.55		
8.6		ML	C	2-3	4.575			4.58		4.58		
8.7		ML	D	2-3	2.55			2.55		2.55		
8.8		ML	E	1-3	6.15			6.15		6.15		

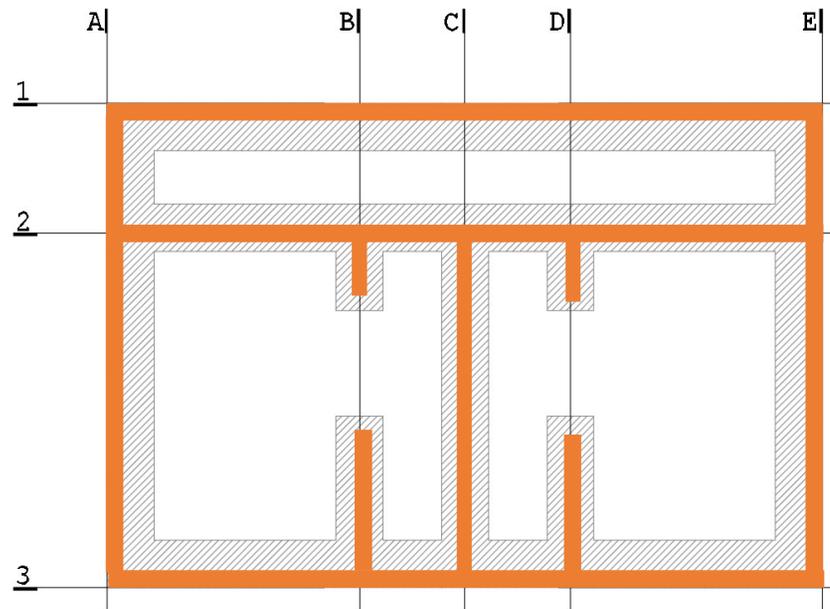


PARTIDA 03: ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
9	Cadena de desplante sección 15x20 con concreto $f'c=150\text{kg/cm}^2$ agrgado máximo de 3/4 reforzada con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4 de diámetro @20cm. Incluye acarreo elevaciones, cimbrado y descimbrado, traslapes, cruces, colado, vibrado, curado y limpiezas.	ML										
9.1		ML	1	A-E	9.15			9.15		9.15	49.43	
9.2		ML	2	A-E	9.15			9.15		9.15		
9.3		ML	3	A-E	9.15			9.15		9.15		
9.4		ML	A	1-3	6.15			6.15		6.15		
9.5		ML	B	2-3	2.55			2.55		2.55		
9.6		ML	C	2-3	4.575			4.58		4.58		
9.7		ML	D	2-3	2.55			2.55		2.55		
9.8		ML	E	1-3	6.15			6.15		6.15		

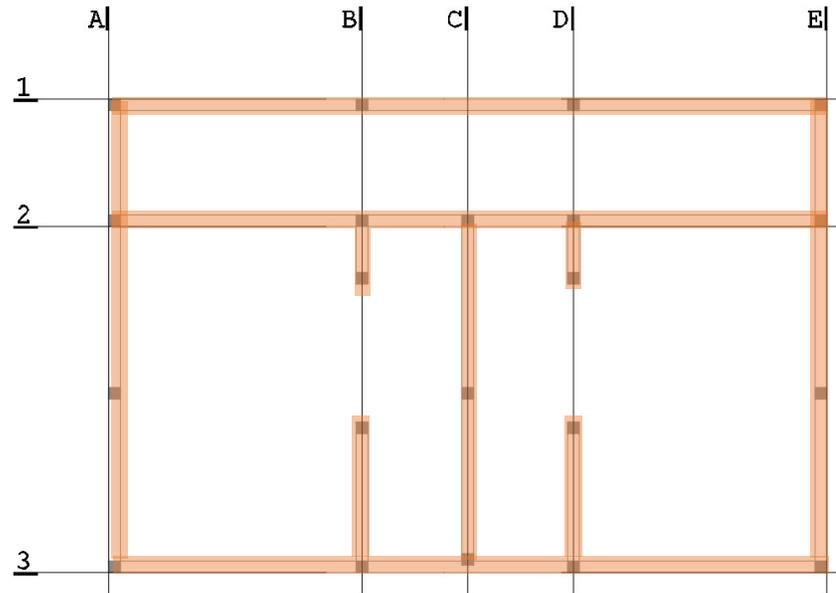


PARTIDA 03: ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
10	Castillo "K1" de sección 15x15, concreto $f'c=150\text{kg/cm}$ , TMA 3/4", reforzado con armex 15x15-4, cimbrado acabado común tres caras. Incluye acarreo de materiales a primera estación a 20mts de distancia	ML										
10.1		ML	A	1-3			3.10		4	12.4	65.1	
10.2		ML	B	1-3			3.10		5	15.5		
10.3		ML	C	2-3			3.10		3	9.3		
10.4		ML	D	1-3			3.10		5	15.5		
10.5		ML	E	1-3			3.10		4	12.4		

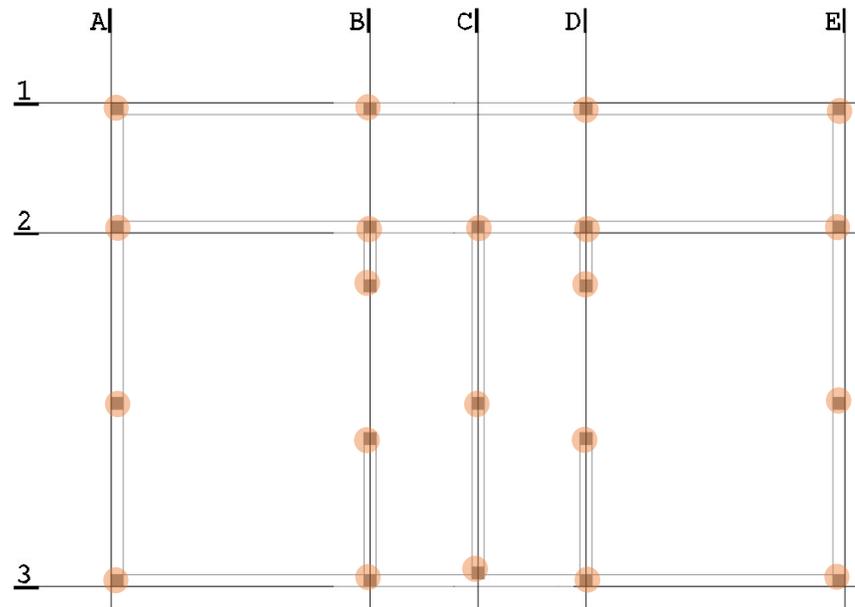


PARTIDA 03: ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
11	Muro de tabique de barro rojo recocido 7x14x28, asentado con mortero cemento-arena 1:3, juntas de 1.5cm de espesor, acabado común, hasta una altura de 3.5mts. Incluye acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M2										
11.1		ML	1	A-E	8.55		3.10			26.51	132.22	
11.2		ML	2	A-E	8.4		3.10			26.04		
11.3		ML	3	A-E	6		3.10			18.60		
11.4		ML	A	1-3	5.55		3.10			17.21		
11.5		ML	B	2-3	2.25		3.10			6.98		
11.6		ML	C	2-3	4.1		3.10			12.71		
11.7		ML	D	2-3	2.25		3.10			6.98		
11.8		ML	E	1-3	5.55		3.10			17.21		

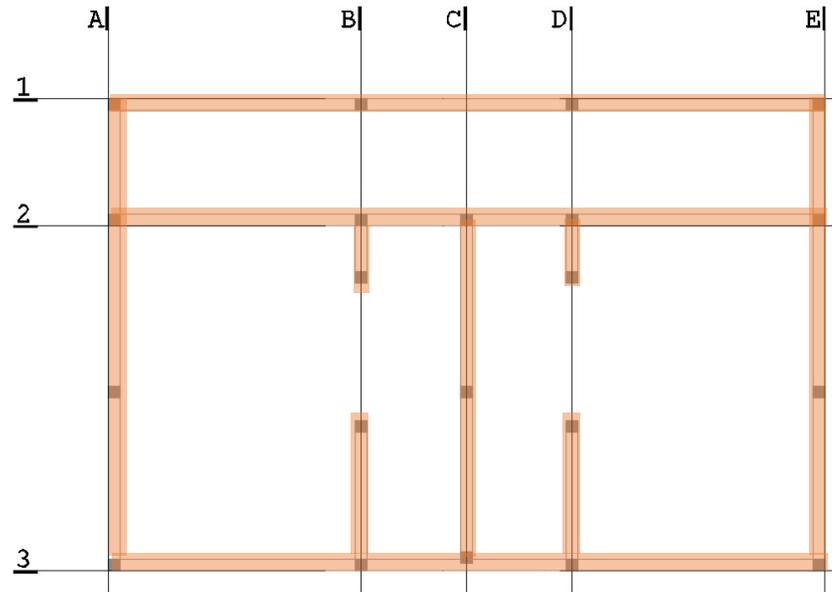


PARTIDA 03: ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
12	Cadenas de cerramiento sección 15x20 con concreto $f'c=150\text{kg/cm}^2$ agrgado máximo de 3/4 reforzada con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4 de diámetro @20cm. Incluye acarreo elevaciones, cimbrado y descimbrado, traslapes, cruces, colado, vibrado, curado y limpiezas.	ML										
12.1		ML	1	A-E	9.15			9.15		9.15	53.48	
12.2		ML	2	A-E	9.15			9.15		9.15		
12.3		ML	3	A-E	9.15			9.15		9.15		
12.4		ML	A	1-3	6.15			6.15		6.15		
12.5		ML	B	2-3	4.575			4.58		4.58		
12.6		ML	C	2-3	4.575			4.58		4.58		
12.7		ML	D	2-3	4.575			4.58		4.58		
12.8		ML	E	1-3	6.15			6.15		6.15		

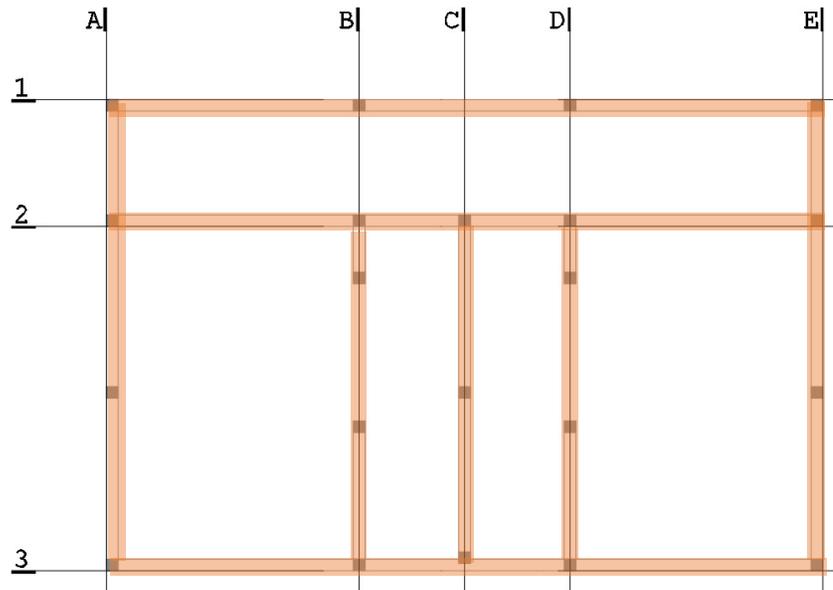


PARTIDA 03: ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
13	Relleno y compactación con bailarina, con material producto de excavación, al 90% de su p.v.s.m., en capas de 20 cm de espesor, humedad óptima, medido compacto. Incluye: acarreo hasta el lugar de la obra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3										
3.1		M3	1	A-E	9.15	0.45	1.4	5.76		5.76	30.85	
3.2		M3	2	A-E	9.15	0.45	1.4	5.76		5.76		
3.3		M3	3	A-E	9.15	0.45	1.4	5.76		5.76		
3.4		M3	A	1-3	6.15	0.45	1.4	3.87		3.87		
3.5		M3	B	2-3	2.32	0.45	1.4	1.46		1.46		
3.6		M3	C	2-3	4.575	0.45	1.4	2.88		2.88		
3.7		M3	D	2-3	2.32	0.45	1.4	1.46		1.46		
3.8		M3	E	1-3	6.15	0.45	1.4	3.87		3.87		

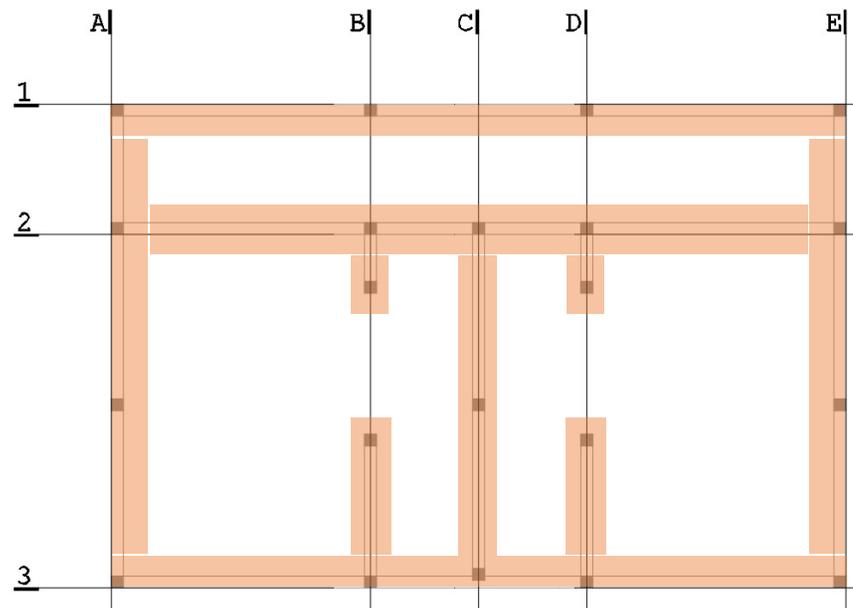


PARTIDA 03: ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
14	Firme de concreto de concreto hecho en obra $f'c=200$ kg/cm <sup>2</sup> , t.m.a. 19 mm de 10 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10.	M2	A-E	2 - 3	9.15	4.575		41.86		41.86	41.86	

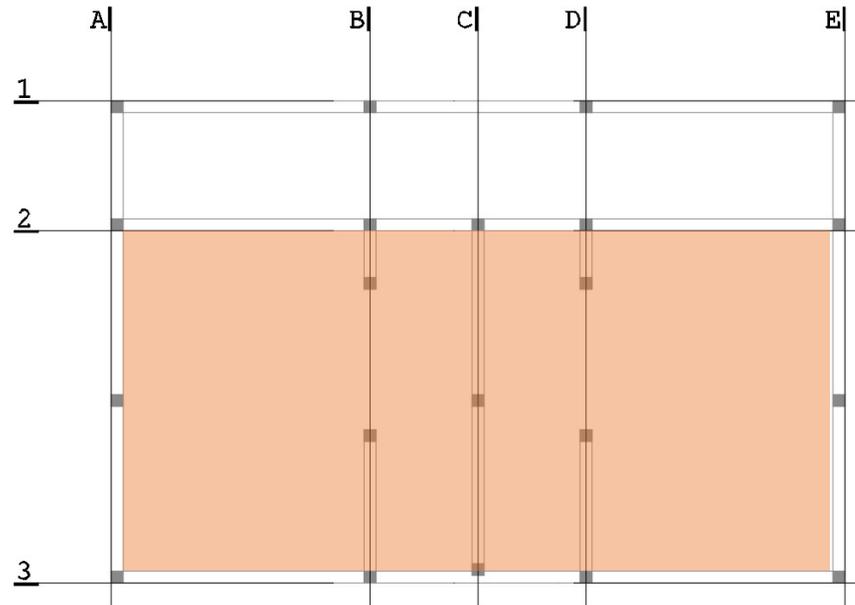


PARTIDA 03: ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
15	Sistema de Losa nervada de 30 cms de espesor, armada con casetones de poliestireno 50x50 cms por 25 cms de peralte, nervaduras armadas de 10x25 cms. Capa de compresión de 5 cms de concreto f'c=200kg/cm2. Incluye tendido de malla electrosoldada 6x6-10/10, incluye: cimbrado y descimbrado, traslapes, cruces, colado, vibrado, curado y limpiezas.	M2	A-E	2 - 3	9.15	4.575		41.86		41.86	41.86	

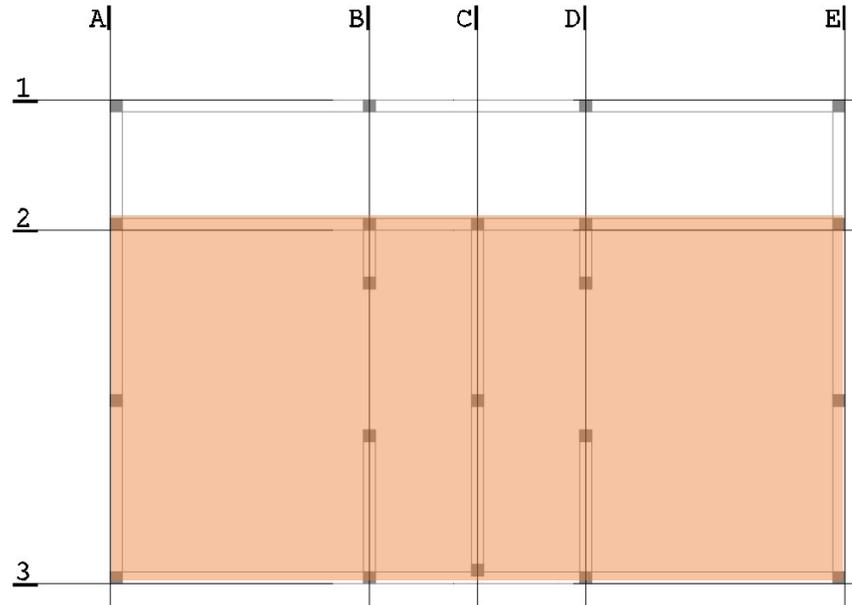


PARTIDA 03: ALBAÑILERÍA Y ESTRUCTURA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
16	Carga y acarreo por medios mecánicos de material producto de excavaciones y/o demoliciones al 1er. km. incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3										
16.1	*DESPALME TOTAL	M3						16.88		16.88	44.79	(EXCAVACIÓN - RELLENO)+DESPALME
16.2	*EXCAVACIÓN	M3						58.76	58.76			
16.3	*RELLENO	M3						30.85	30.85			
17	Acarreo a kms. Subsecuentes de material producto de excavaciones y/o demoliciones, zona urbana, tránsito normal. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario	M3										
17.1	*DESPALME TOTAL	M3						16.88		16.88	44.79	(EXCAVACIÓN - RELLENO)+DESPALME
17.2	*EXCAVACIÓN	M3						58.76	58.76			
17.3	*RELLENO	M3						30.85	30.85			

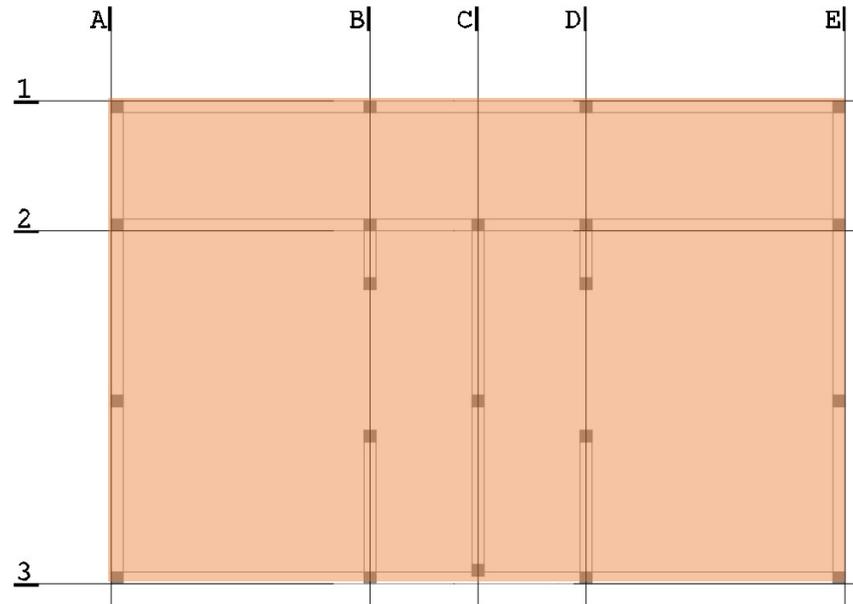


PARTIDA 04: INSTALACIÓN SANITARIA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
18	Excavación a mano material tipo "1", zona "A" seco cepas de 30 cms de ancho por 0 a 1mts. De profundidad Para colocación de registro y red sanitaria. Incluye afloje, extracción, amacice, limpieza de plantilla y taludes, medida de banco.	M3										
18.1		M3	A-E	1 - 3	25.8	0.3	0.6	4.64		4.64	4.81	Red sanitaria
18.2		M3	A-E	1 - 3	0.9	0.3	0.6	0.16	0.16	Registro		

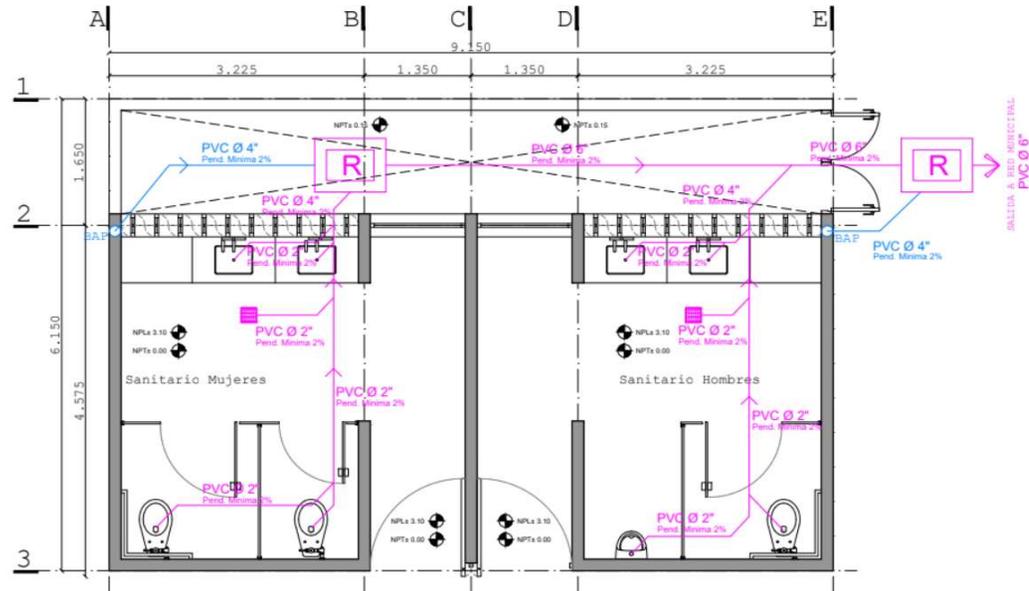


PARTIDA 04: INSTALACIÓN SANITARIA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
19	Construcción de registro sanitario de 0.40x0.60 m y hasta 1.00 m profundidad (medidas interiores) de tabique rojo recocido (14 cm de espesor) juntado con mortero cemento-arena 1:3 y aplanado interior de 2.00 cm con mortero cemento-arena 1:5 acabado pulido, plantilla de pedacería de tabique de 5 a 7 cm de espesor, base de concreto pobre f'c= 150 kg/cm2, hecho en obra TMA 19 mm, media caña variable, tapa de concreto f'c=150 kg/cm2 tma 19mm de 0.65x0.45 m de 7 cm de espesor, armada con varilla de 3/8" de @20 cm en sentido corto y conformada por un marco de ángulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/8" y contramarco de ángulo de 1 1/2"x1 1/2"x1/8". Incluye: excavaciones, rellenos, plomeado, alineado, nivelado, cimbra y descimbra, colado, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución del trabajo, limpiezas, trabajo terminado	PZA							2		2.00	

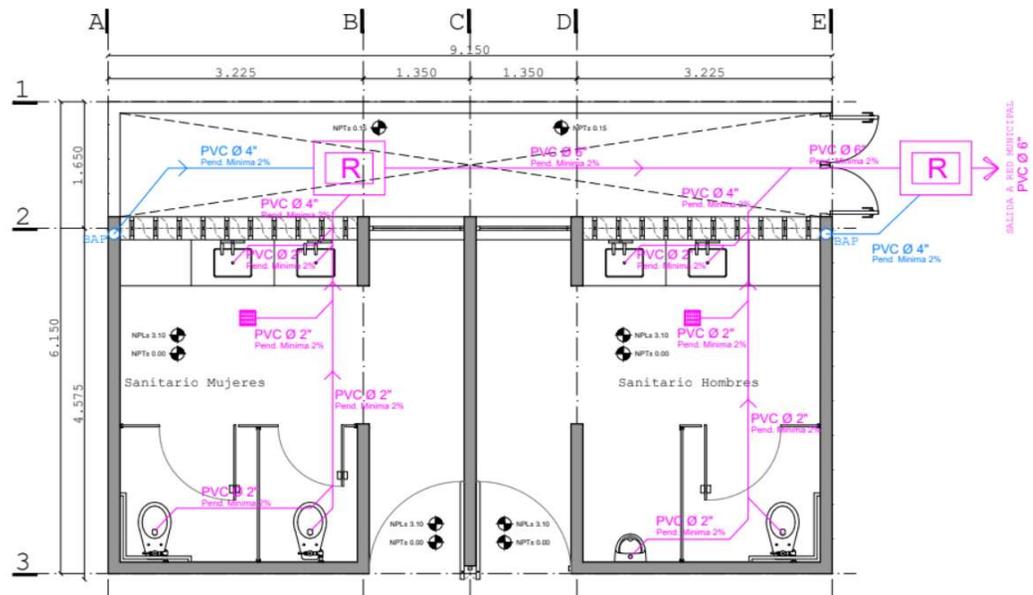


PARTIDA 04: INSTALACIÓN SANITARIA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
20	Cama de arena de 5cm de espesor x 30 de ancho, para asiento de tubería. Incluye mano de obra, herramienta y equipo necesario.	ML	A-E	1 - 3	25.8			25.80			25.80	

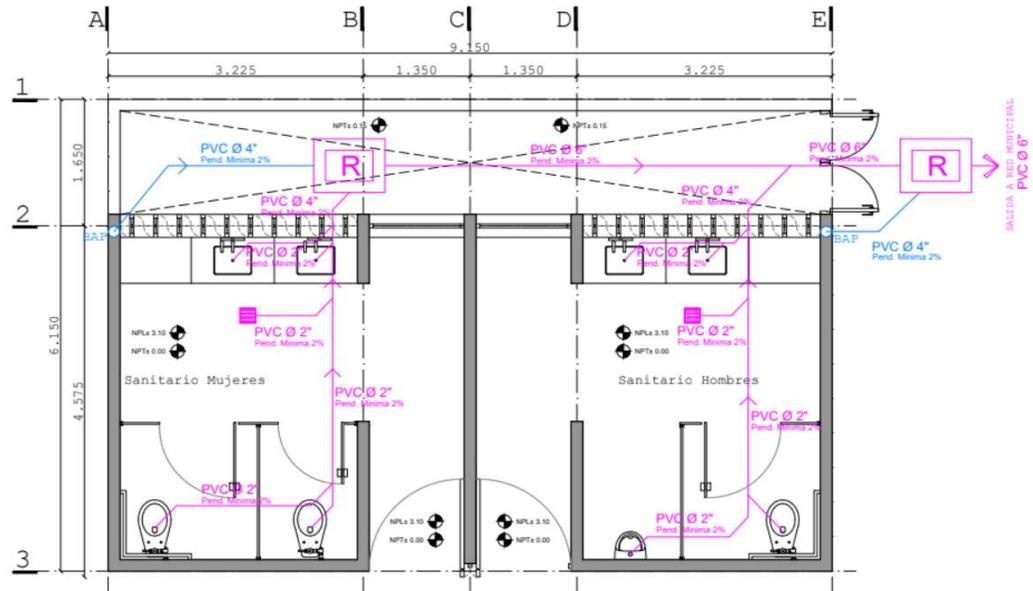


PARTIDA 04: INSTALACIÓN SANITARIA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
21	Relleno y compactación con bailarina, con material producto de excavación a nivel de terreno. Incluye: acarreo hasta el lugar de la obra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M3										
21.1	*EXCAVACIÓN	M3	A-E	1 - 3				4.81		4.81	4.22	EXCAVACIÓN - ((VOL. TUBERÍA 4") + (VOL. CAMA DE
21.2	*VOLUMEN TUBERÍA	M3	A-E	1 - 3	25.8			0.0078		0.20		
22.2	*VOLUMEN CAMA DE ARENA	M3	A-E	1 - 3	25.8	0.3	0.05	0.39		0.39		

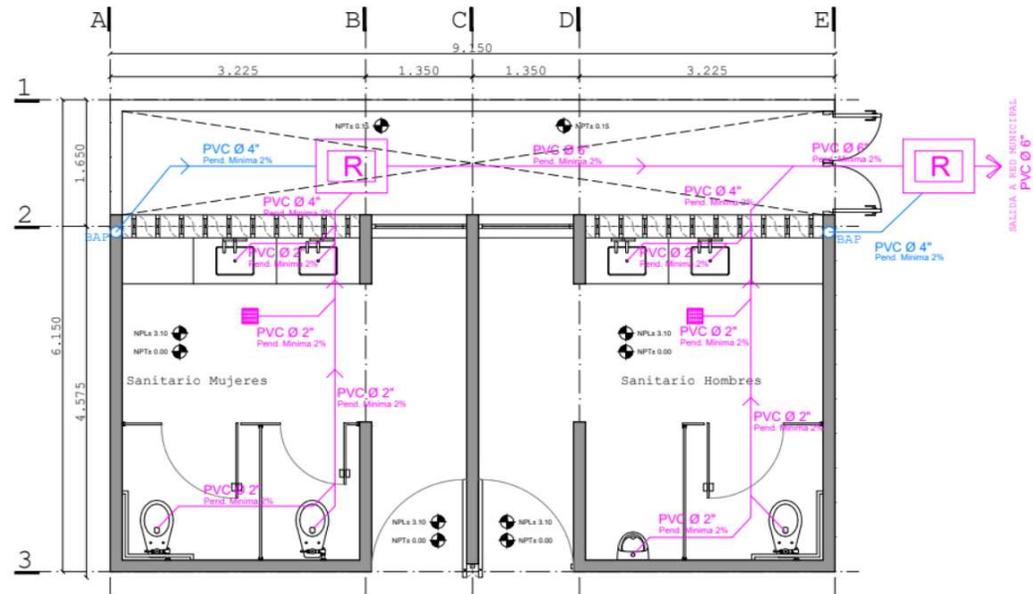


PARTIDA 04: INSTALACIÓN SANITARIA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
22	Salida Sanitaria a Base de Tubería de PVC de Norma de 4" y 2". Incluye: Codos, Tees, Coples, Pegamento Azul, Excavaciones, Rellenos, Remates a Registro, Pruebas de Funcionamiento, Resanes en Muros con Mortero Cemento-Arena 1:3, Metal Desplegado	PZA	A-E	1-3				10.00			10.00	

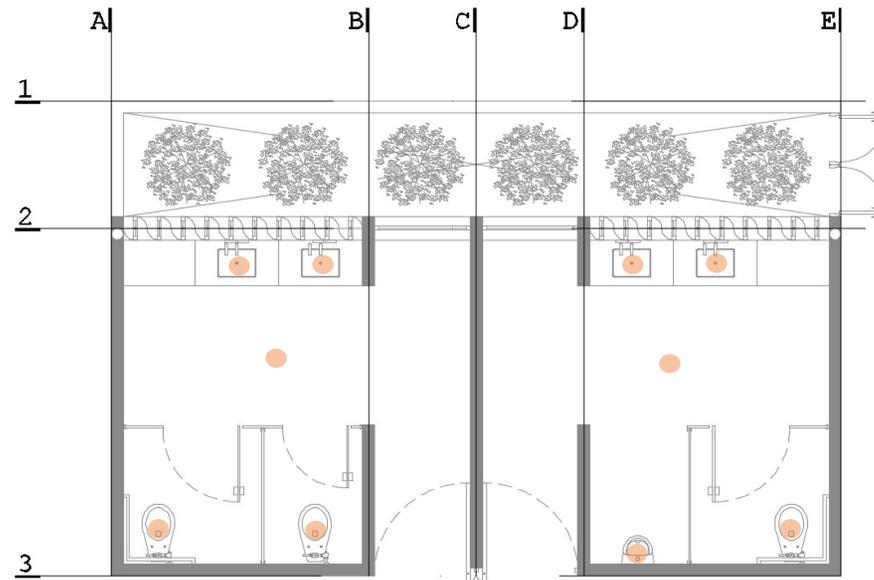

PARTIDA 04: INSTALACIÓN SANITARIA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
23	Bajante de Aguas Pluviales a Base de Tubería de PVC de Norma de 3". Incluye: Codo 45° para Remate en Azotea, Metal Desplegado Cal 600, Armex 15x20-4, Colado como Castillo de refuerzo, Resanes con Mortero Cemento-Arena 1:3, Pruebas, (2.60m Aprox)	PZA	A-E	1-3				2.00			2.00	

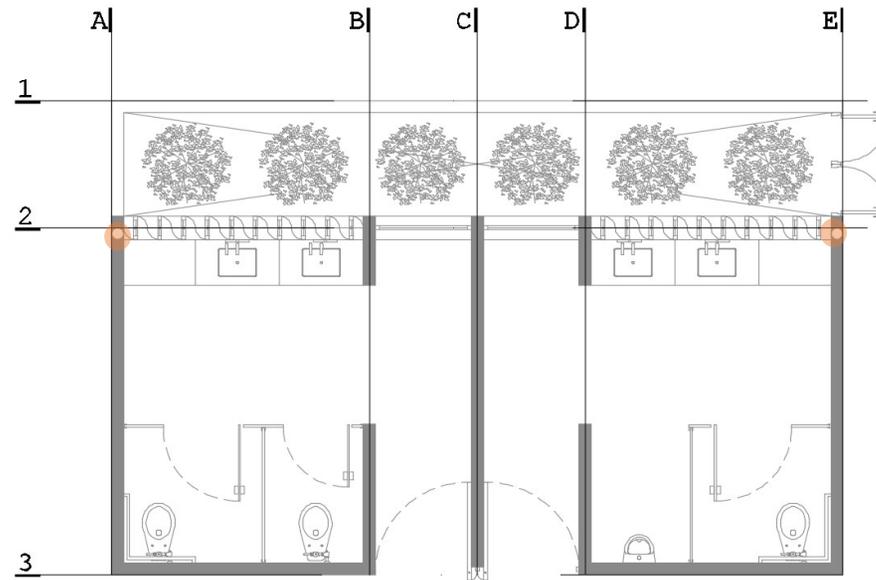


PARTIDA 05: INSTALACIÓN HIDRÁULICA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
24	Suministro e instalación de cuadro de válvulas a base de tubo de fierro galvanizado de 38mm. Incluye codos, medidor, llave nariz, valvula compuerta, niples, equipo necesario y trabajo terminado.	PZA	A-E	1 - 3				1.00			1.00	

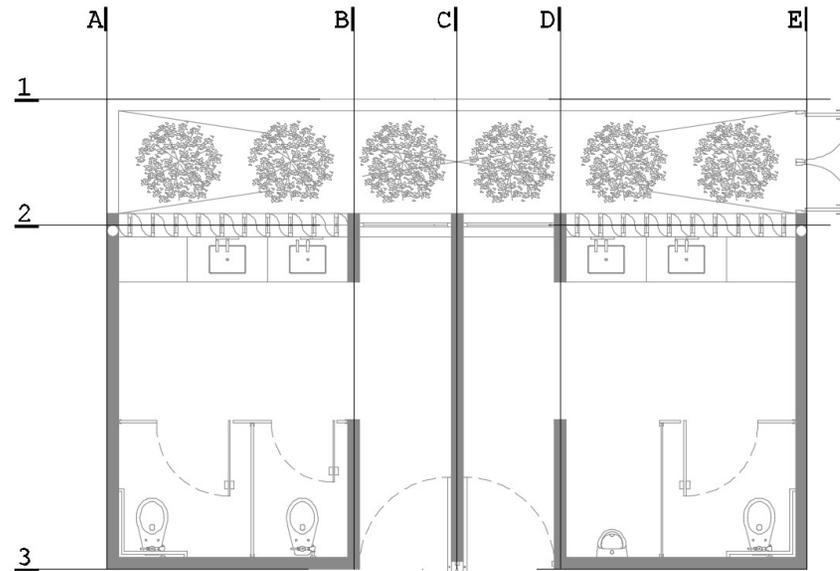


fuera


PARTIDA 05: INSTALACIÓN HIDRÁULICA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
25	Suministro y tendido de tubería de fierro galvanizado de 38 mm. Incluye cortes, desperdicios, acoplamiento, pasta, fletes, pruebas, acarreo, material, mano de obra y equipo necesario.	ML	A-E	1 - 3	20.1		7.05	27.15			27.15	

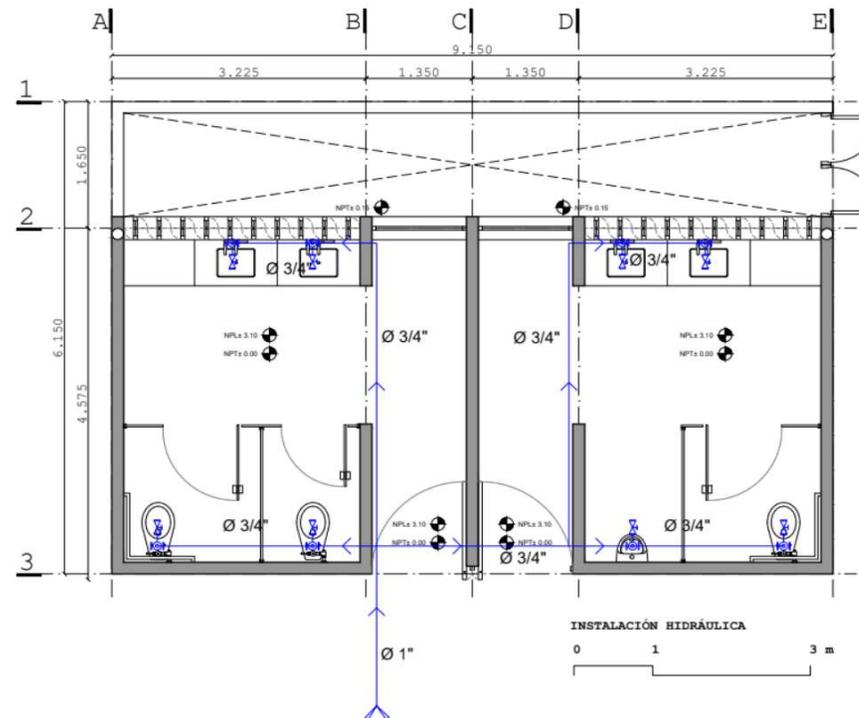


PARTIDA 05: INSTALACIÓN HIDRÁULICA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
26	Suministro y colocación de conector de fierro galvanizado, cuerda interior tipo, diámetro de 38mm. incluye ranuras, resanes, cortes, desperdicios, acoplamiento, soldadura, pasta, fletes, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	A-E	1-3				8.00			8.00	

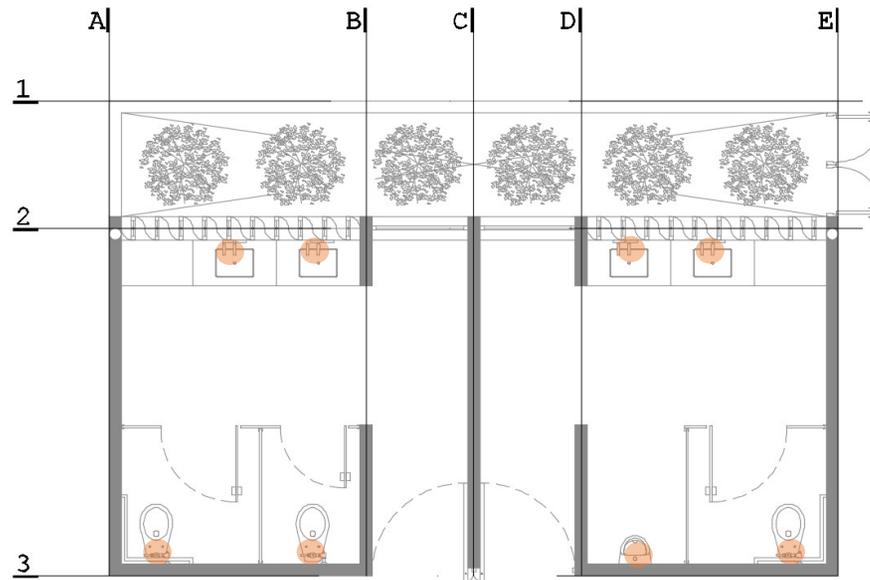

PARTIDA 05: INSTALACIÓN HIDRÁULICA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
27	Salida Hidráulica de Agua Fría y Caliente a Base Salida Hidráulica de Agua Fría y Caliente a Base de Tubería de Clase 16, 25 mm (3/4") copolipropileno random (PP-R) Sistema por Termofusiones de mismo material. Incluye: Materiales, Conexiones y Accesorios Necesarios (Llaves Angulares, Tees, Codos, Coples, Reducciones, Conectores), Jarros de Aire Necesarios, Pintura	PZA	A-E	1 - 3				8.00			8.00	

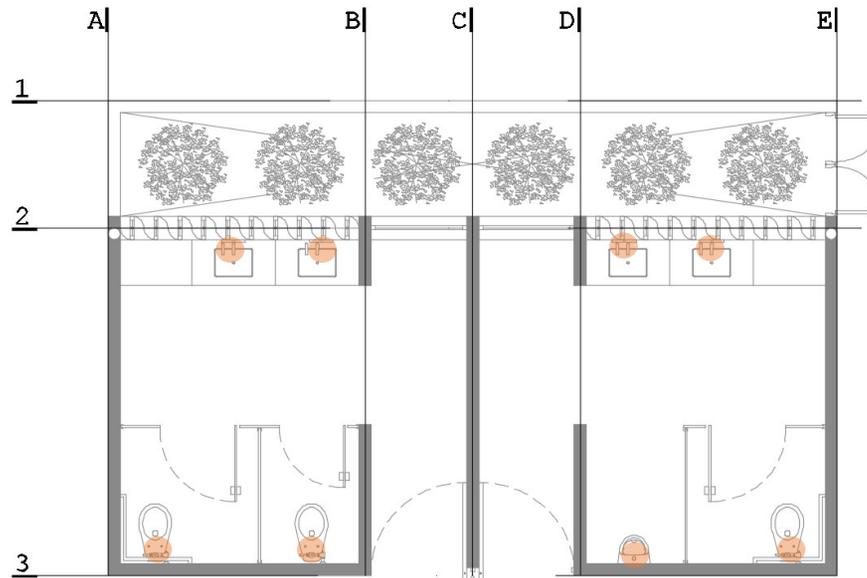


PARTIDA 05: INSTALACIÓN HIDRÁULICA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
28	Suministro y colocación de medidor de agua potable, incluye mano de obra y materiales requeridos, trazo, alineado, resanado con mortero cemento-arena 1:5, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución del trabajo, limpiezas, trabajo terminado.	PZA	A-E	1-3				1.00			1.00	

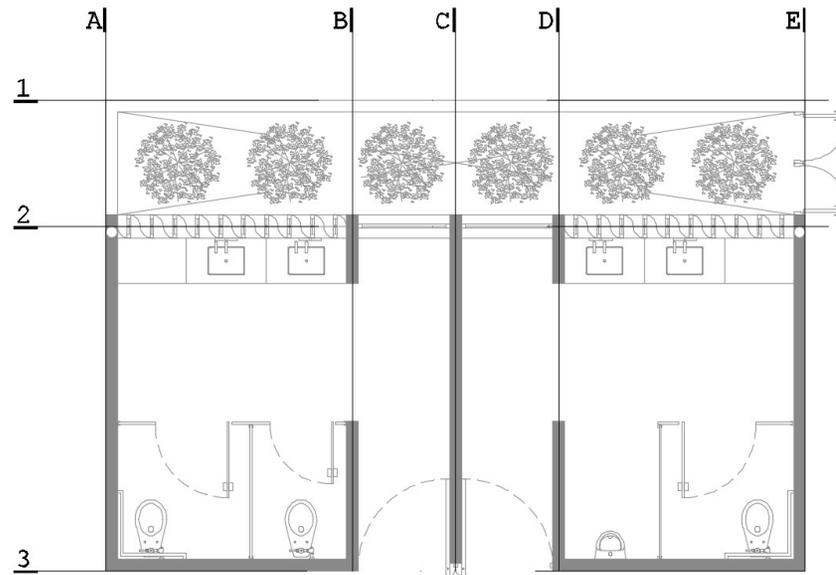


fuera

PARTIDA 06: INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
29	Mona para Acometida Eléctrica. Incluye: Base para Medidor Mca IUSA 127W, Centro de Carga QO-2 Mca. BTICINO Tensión Máxima 120/240 Frac 60 Hz, Interruptor Termomagnético 1x40amp, Codo de PVC R-1 Pesado de 1 1/4", Salida de Timbre, Tierra Física a Base de Varilla Coperwell de 1/2" x 1.00m, 1 caja chalupa, 1 caja cuadrada 4x4, cable para tierra física #8 verde o desnudo, material y mano de obra, instalación, trabajo terminado.	PZA	A-E	1 - 3				1.00			1.00	

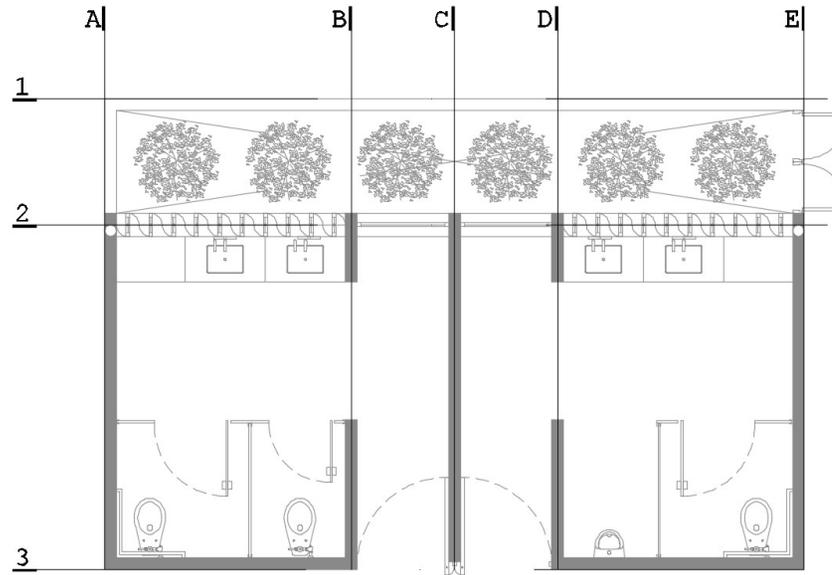


fuera

PARTIDA 06: INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
30	Acometida eléctrica, colocación de base monofásica con 5a terminal 1 fase 2 hilos 100 amp. marca square d a 1.80 m. del npt., con tubo conduit de fo.galv. pared gruesa de 32 mm. x 3.00 m. de longitud con mufa de 32 mm. , incluye: preparacion con tubo conduit de pvc tipo pesado 32 mm. x 2.20 m. promedio, curva o codo de 32 mm. - 90 grados. incluye: colocación de sistema de tierra física a base de varilla coperwelld de 19 mm de diámetro y de 3.05 m de longitud marca cadwell, excavacion, limpiezas.	PZA	A-E	1 - 3				1.00			1.00	

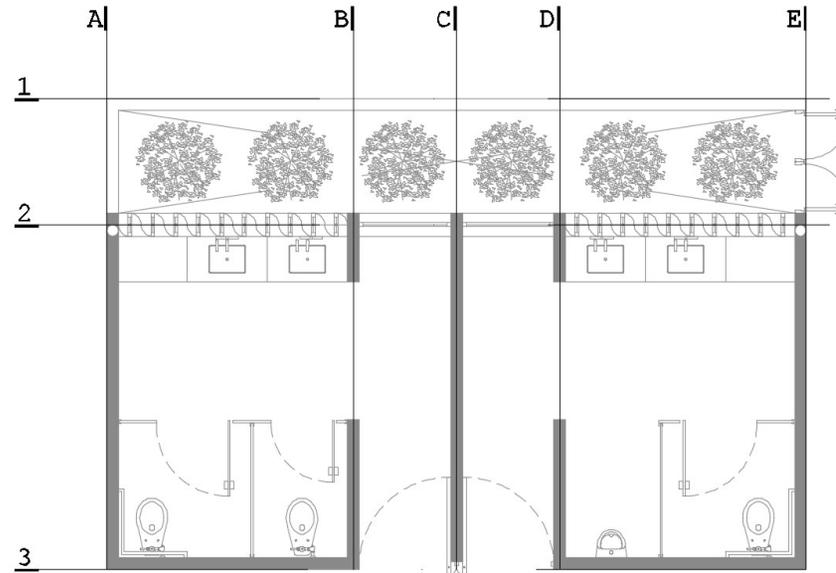


fuera


PARTIDA 06: INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
31	Sum y coloc de centro de carga qo-8 para empotrar mca iusa, square-d y bticino. Tensión máxima 120/240 v. Frecuncia 60 Hz. Incluye: conexiones, alineado, ranurado y resanes.	PZA	A-E	1 - 3				2.00			2.00	

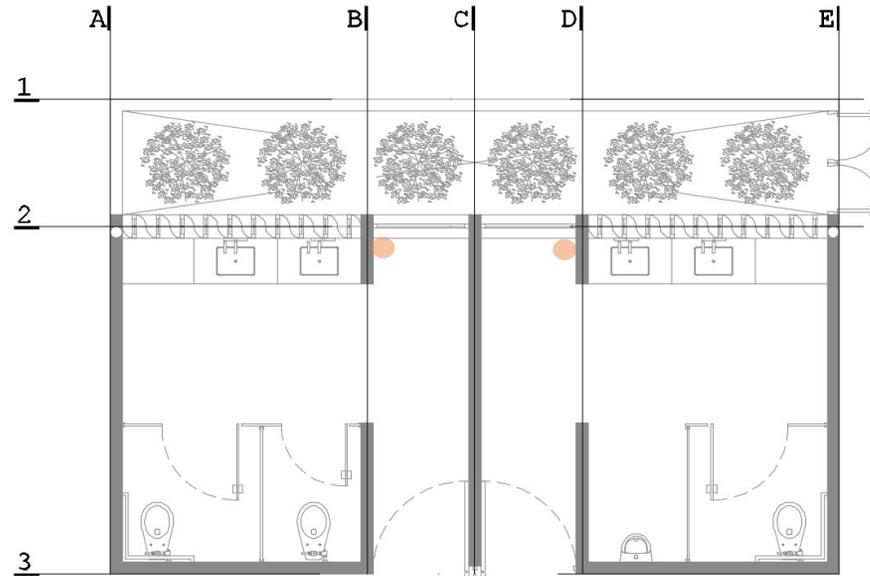


PARTIDA 06: INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
32	Suministro e instalacion de tubo galvanizado. Incluye mufa, tornillería, alineado, conexiones, acarreo dentro de la obra, elevaciones, cualquier altura, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución del trabajo, limpiezas.	PZA	A-E	1-3				1.00			1.00	

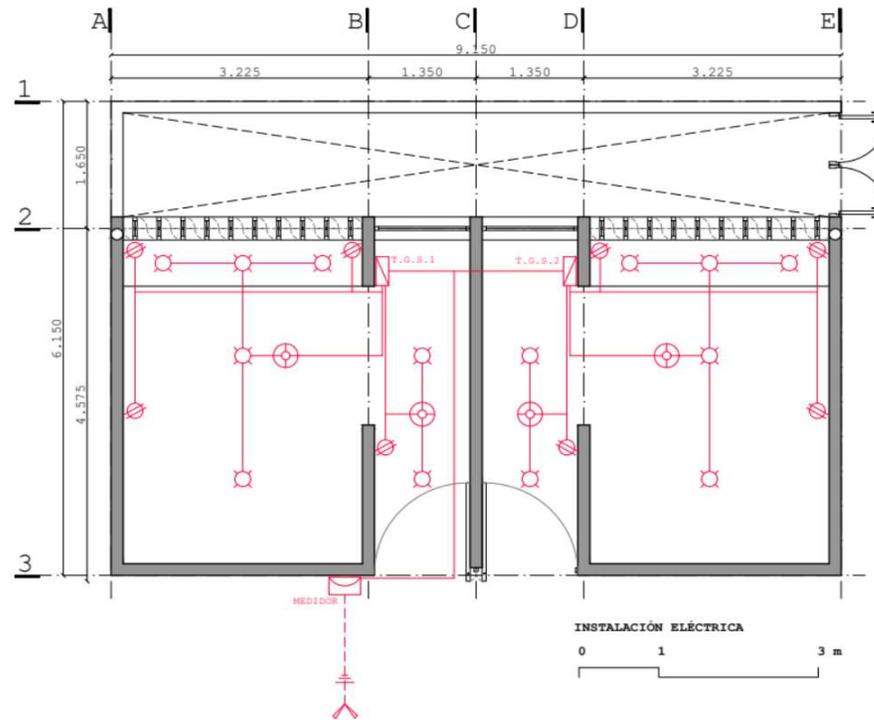


PARTIDA 06: INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
33	Salida Eléctrica de Centro y/o Contacto a Base de Poliducto Reforzado de 19 y 13mm Cables del 8,10, 12 y 14 Normado. Incluye: Guías, Cajas Cuadradas 4x4", Chalupas, Cinta de Aislar, Pruebas de Funcionamiento, 3 Circuitos (c1=Iluminación, c2=Contactos, c3=Reserva) Cable desnudo #12 normado, las puntas de salidas eléctricas deben ser con cable del #8.	SALIDA	A-E	1 - 3				26.00			26.00	

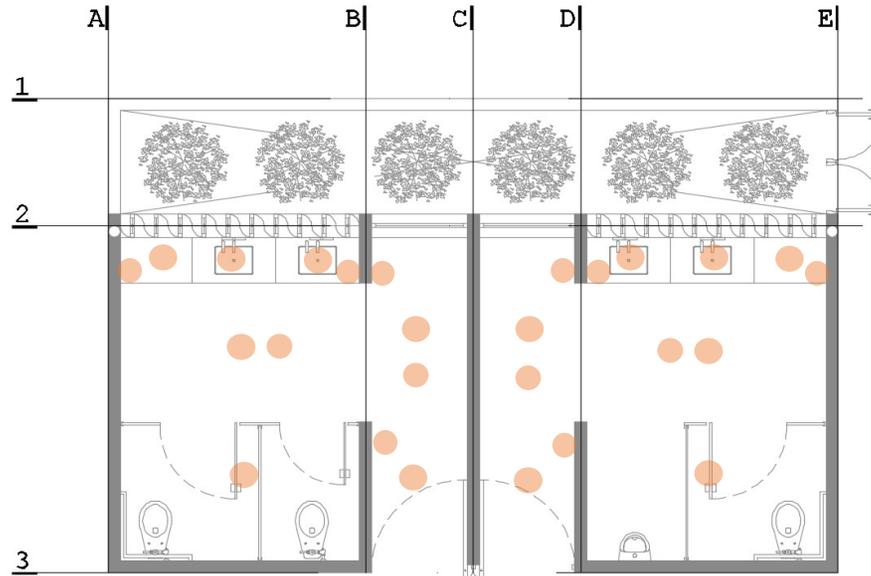


PARTIDA 06: INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
34	Suministro y colocación de luminaria tipo empotr en bote integral cat. Co1074b mca. Construlita, con lampara halógena mr16 de 50w, transformador electrónico no. Cat. Ac1048n mca. Construlita, conectado a 127v. Incluye: mano de obra y materiales requeridos, lámpara, transformador, bote integral, conexiones, acarrees dentro de la obra, fletes, alineado, elevaciones, cualquier altura, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecucion del trabajo, limpiezas.	PZA	A-E	1-3				14.00			14.00	

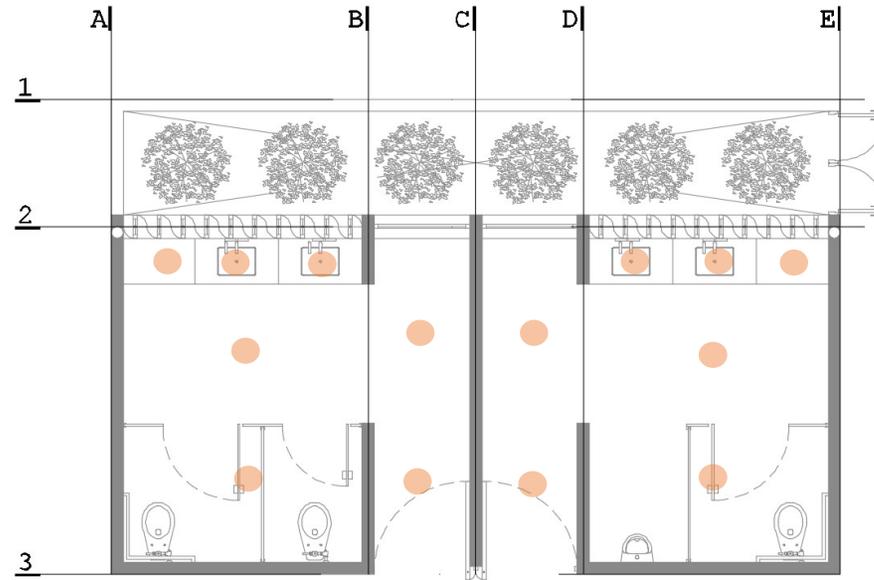


PARTIDA 06: INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
35	Suministro y colocacion de Sensor de movimiento Techo Voltech modelo 46 599, incluye: fijacion, alineado, trabajo terminado.	PZA	A-E	1 - 3				4.00			4.00	

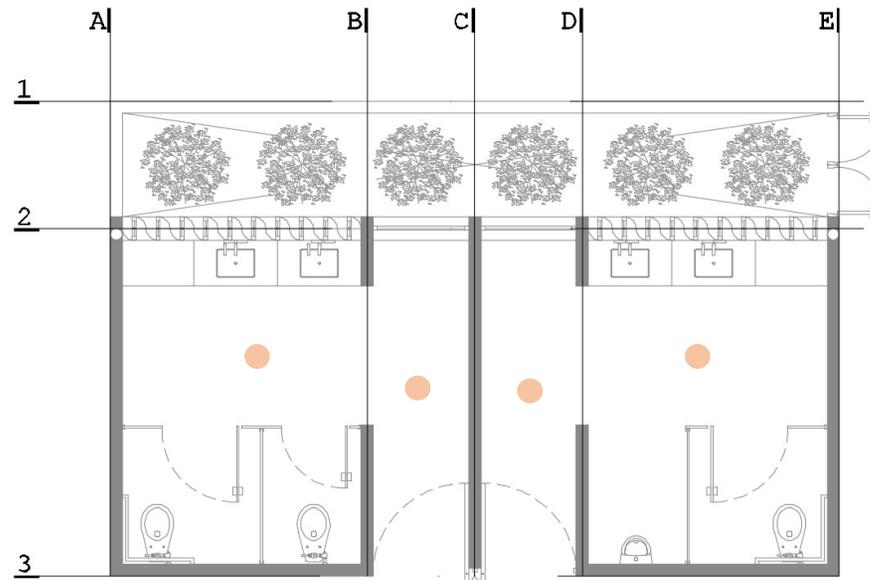


PARTIDA 06: INSTALACIÓN ELÉCTRICA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
36	Suministro y colocacion de toma corriente duplex falla a tierra icft serie 23 con chasis y placa cava mate mca simon color cava mate incluye: fijacion, alineado, trabajo terminado	PZA	A-E	1 - 3				8.00			8.00	

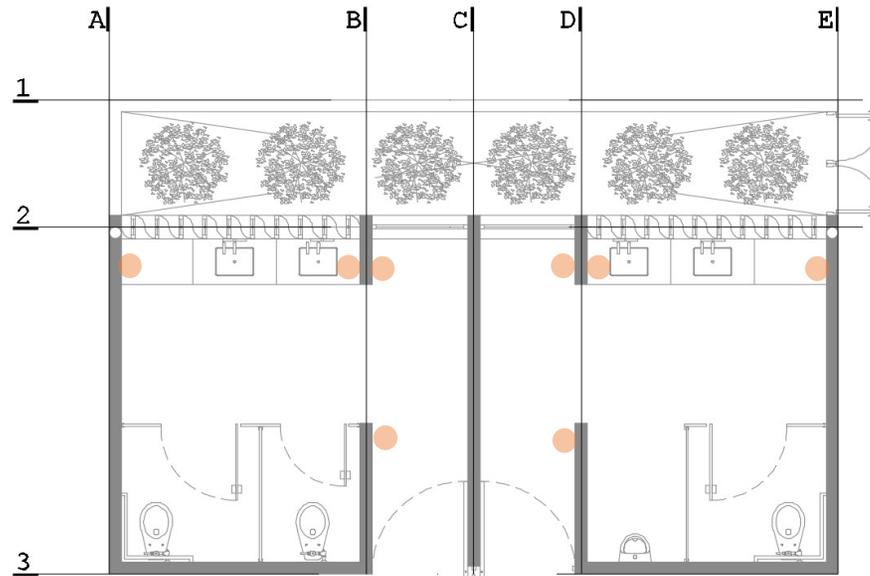


PARTIDA 07: ACABADOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
37	Repellado acabado rústico en muro de mezcla de mortero de cemento-arena proporción 1:3 de 2cm de espesor, para recibir losetas cerámicas. Incluye humedecido del area hasta 6m de altura, filos y boquillas, goterones, remates en pretilos, metal desplegado cal. 600 en áreas de concreto, trabajo terminado.	M2										
37.1		M2	A	2-3	4.5		3.10	13.95		13.95	115.78	
37.2		M2	B	2-3	5.85		3.10	18.14		18.14		
37.3		M2	C	2-3	9.1		3.10	28.21		28.21		
37.4		M2	D	2-3	5.85		3.10	18.14		18.14		
37.5		M2	E	2-3	4.5		3.10	13.95		13.95		
37.6		M2	2	A-E	6		0.80	4.80		4.80		
37.7		M2	3	A-E	6		3.10	18.60		18.60		

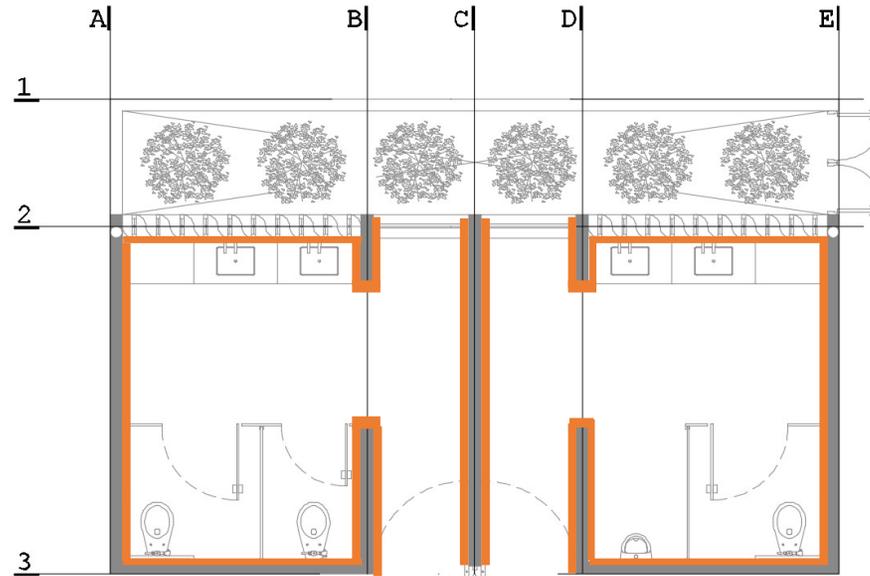


PARTIDA 07: ACABADOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
38	Aplanado fino en muro de mezcla de mortero de cemento arena proporción 1:3 de 2cm de espesor, para recibir pintura. Incluye humedecido del area hasta 6m de altura, filos y boquillas, goterones, remates en pretilas, metal desplegado cal. 600 en áreas de concreto, trabajo terminado.	M2										
38.1		M2	1	A-E	9		3.85	34.65		34.65	54.65	
38.2		M2	2	A-B, D-E	6.3		1.65	10.40		10.40		
38.3		M2	2	B-D	2.55		0.60	1.53		1.53		
38.4		M2	2	C	0.15		3.85	0.58		0.58		
38.5		M2	A	1-2	1.35		3.85	5.20		5.20		
38.6		M2	E	1-2	1.35		1.70	2.30		2.30		

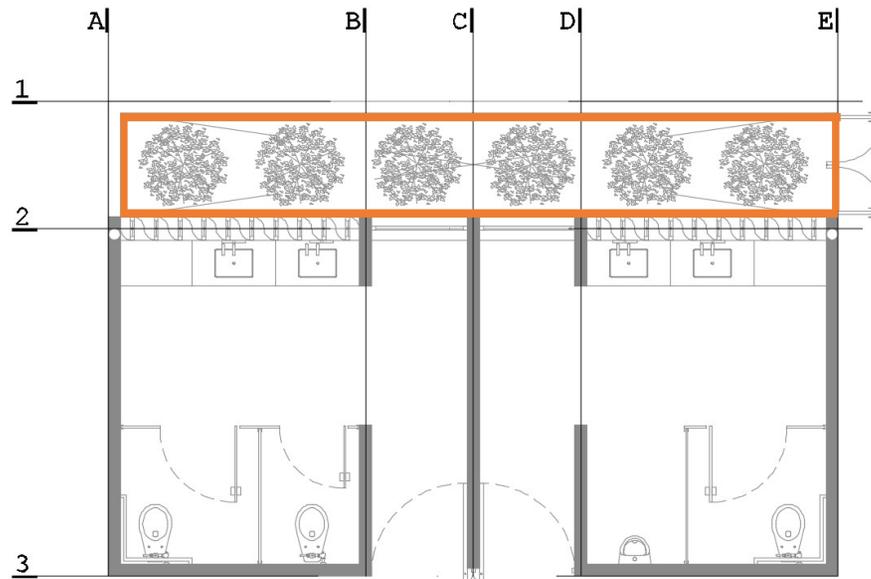


PARTIDA 07: ACABADOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
39	Aplanado de yeso acabado pulido de 2cm de espesor en plafón para recibir pintura. Incluye preparacion de superficie, sum y col de metal desplegado en zonas de concreto, acarreo, elevaciones y andamios.	M2	A-E	2-3	9.15	4.575		41.86		41.86	41.86	

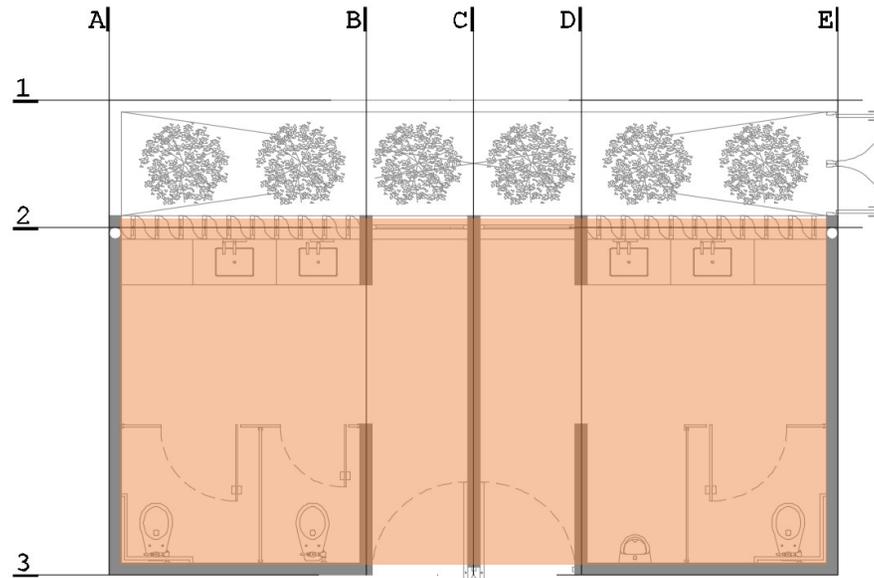


PARTIDA 07: ACABADOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
40	Suministro y aplicación en muro y plafón de pintura Blanca marca BEREL línea BERELINTE. Incluye una mano de sellador, dos manos de pintura, acarreo dentro de la obra, elevaciones, cualquier altura, protección de áreas adyacentes, limpiezas, trabajo terminado.	M2										
40.1		M2	A-E	2-3	9.15	4.57		41.82		41.82	96.46	Losa
40.2		M2	1	A-E	9		3.85	34.65	34.65	Muros		
40.3		M2	2	A-B, D-E	6.3		1.65	10.40	10.40			
40.4		M2	2	B-D	2.55		0.60	1.53	1.53			
40.5		M2	2	C	0.15		3.85	0.58	0.58			
40.6		M2	A	1-2	1.35		3.85	5.20	5.20			
40.7		M2	E	1-2	1.35		1.70	2.30	2.30			

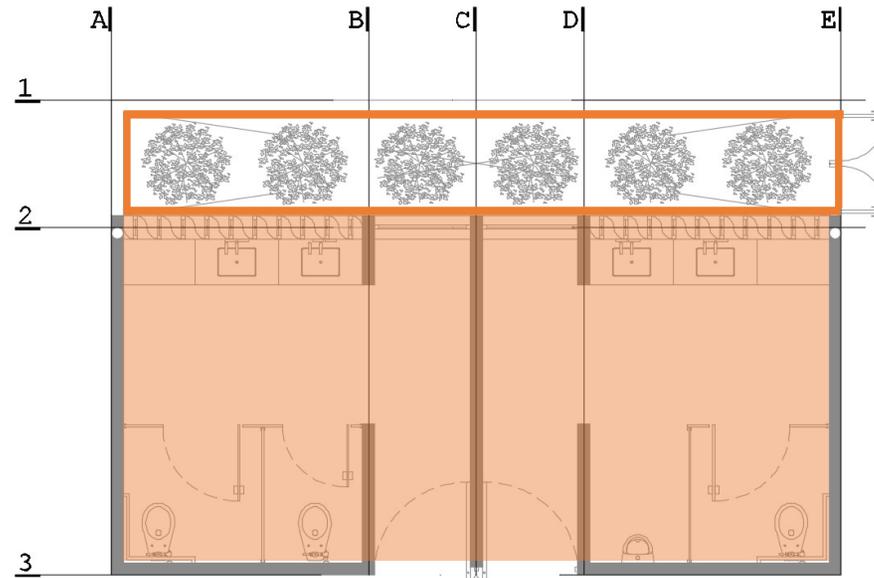


PARTIDA 07: ACABADOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
41	Suministro y aplicación en muro y piso de loseta cerámica marca INTERCERAMIC 60x60 cm, Línea CITYLINE IVORY, asentada con adhesivo gris a hueso. Incluye cortes rectos, remates, desperdicios, fletes, acarreo hasta el lugar de la obra, maniobras de elevación, materials, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M2										
41.1		M2	2	A-B, D-E	6.3		0.10	0.63		0.63	39.44	Muros
41.2		M2	3	A-B, D-E	6.3		0.10	0.63	0.63			
41.3		M2	A	2-3	4.2		0.10	0.42	0.42			
41.4		M2	B	2-3	5.15		0.10	0.52	0.52			
41.5		M2	C	2-3	9.1		0.10	0.91	0.91			
41.6		M2	D	2-3	5.15		0.10	0.52	0.52			
41.7		M2	E	2-3	4.2		0.10	0.42	0.42			
41.8		M2	A-B	2-3	3	4.2		12.60	12.60			
41.9		M2	B-C	2-3	1.2	4.25		5.10	5.10			
41.10		M2	C-D	2-3	1.2	4.25		5.10	5.10			
41.11		M2	D-E	2-3	3	4.2		12.60	12.60			

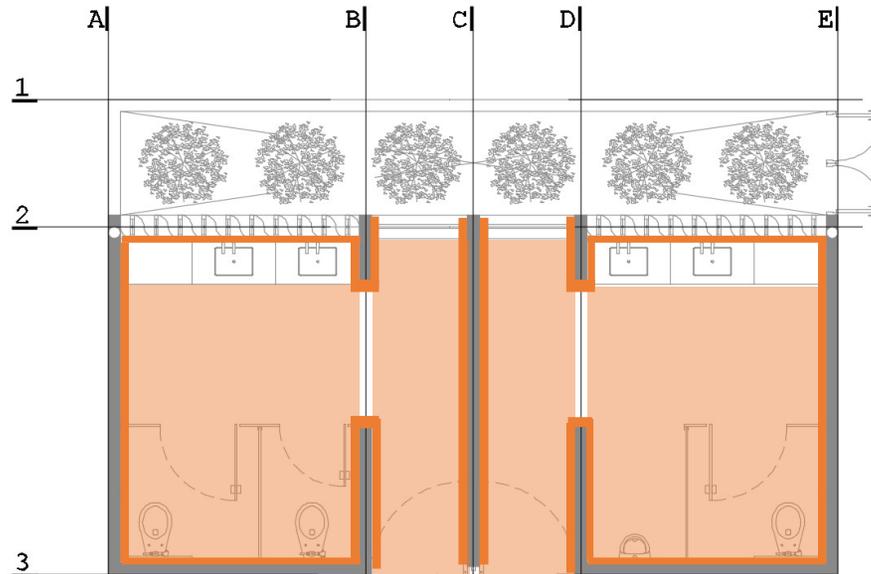


PARTIDA 07: ACABADOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
42	Suministro y aplicación en muro de loseta cerámica marca INTERCERAMIC 60x60 cm, Línea CITYLINE DARK GRAY, asentada con adhesivo gris a hueso. Incluye cortes rectos, remates, desperdicios, fletes, acarreo hasta el lugar de la obra, maniobras de elevación, materials, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M2										
42.1		M2	2	A-B, D-E	6		0.80	4.80		4.80	112.20	
42.2		M2	3	A-B, D-E	6		3.00	18.00		18.00		
42.3		M2	A	2-3	4.5		3.00	13.50		13.50		
42.4		M2	B	2-3	5.85		3.00	17.55		17.55		
42.5		M2	C	2-3	9.1		3.00	27.30		27.30		
42.6		M2	D	2-3	5.85		3.00	17.55		17.55		
42.7		M2	E	2-3	4.5		3.00	13.50		13.50		

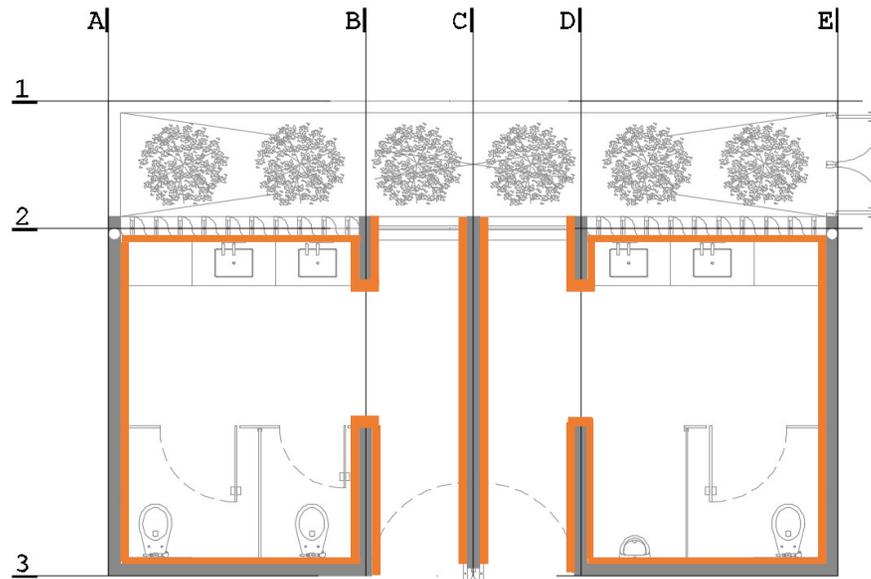


PARTIDA 07: ACABADOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
43	Suministro y aplicación en piso de granito color negro marca LEVATINA, modelo NEGRO GALAXY, asentada con adhesivo gris a hueso. Incluye cortes rectos, remates, desperdicios, fletes, acarreo hasta el lugar de la obra, maniobras de elevación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M2										
43.1		M2	2	B-D	2.4	0.3		0.72		0.72	1.50	
43.2		M2	3	B-D	2.4	0.1		0.24		0.24		
43.3		M2	B	2-3	0.15	1.8		0.27		0.27		
43.4		M2	D	2-3	0.15	1.8		0.27		0.27		

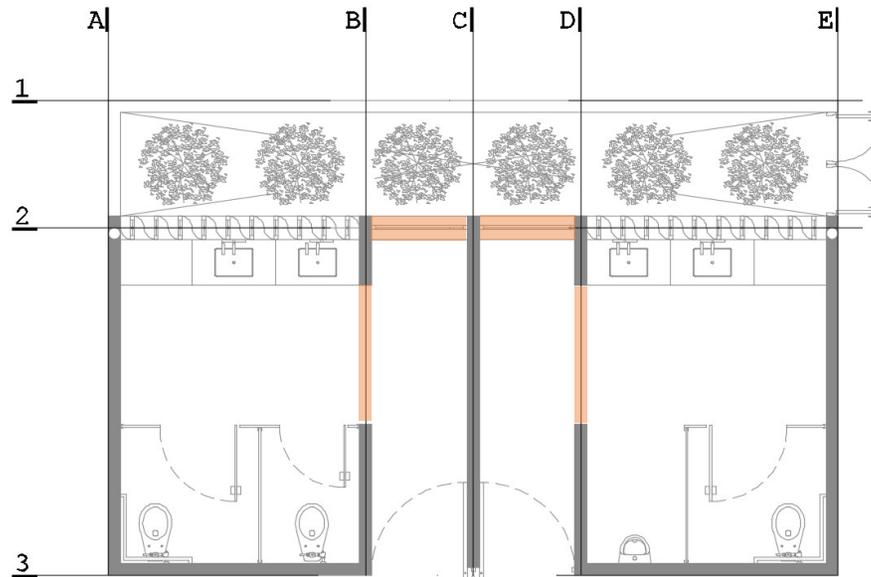


PARTIDA 08: MUEBLES DE BAÑO												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
44	Suministro y colocación de Sanitario marca SLOAN para fluxómetro modelo ST-2029 Water Closet and GEM-2 111 SFSM Flushometer. Incluye: materiales, mano de obra, herramienro, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					3	3	3.00	

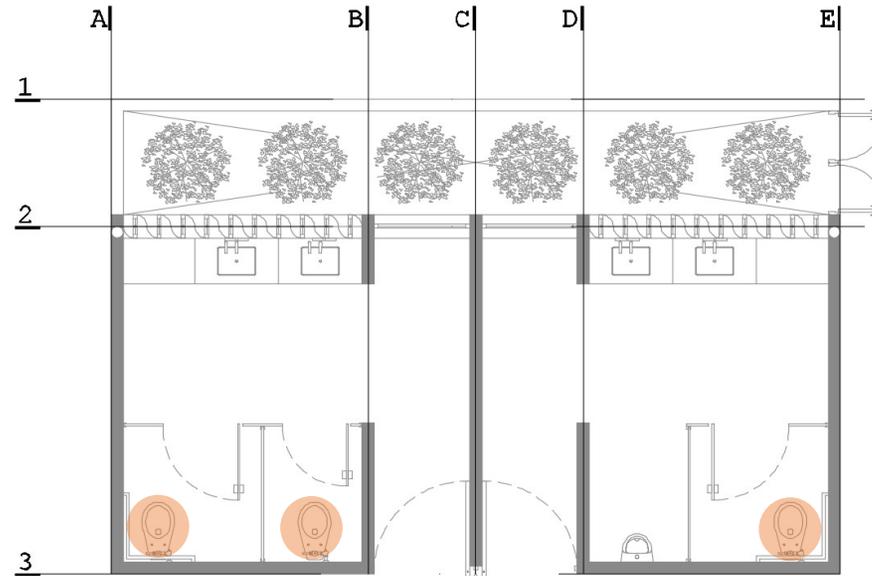


PARTIDA 08: MUEBLES DE BAÑO												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
45	Suministros y colocación de Fluxómetro marca SLOAN, modelo GEM-2 111 SF5M. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					3	3	3.00	

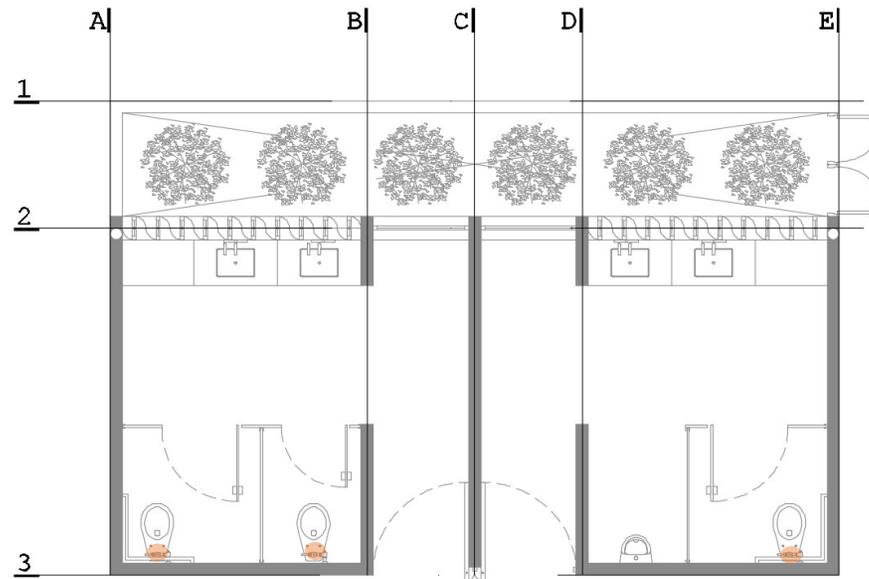


PARTIDA 08: MUEBLES DE BAÑO												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
46	Suministro y colocación de Mingitorio marca SLOAN, modelo SU-7009. Incluye: materiales, mano de obra, herramienro, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					1	1	1.00	

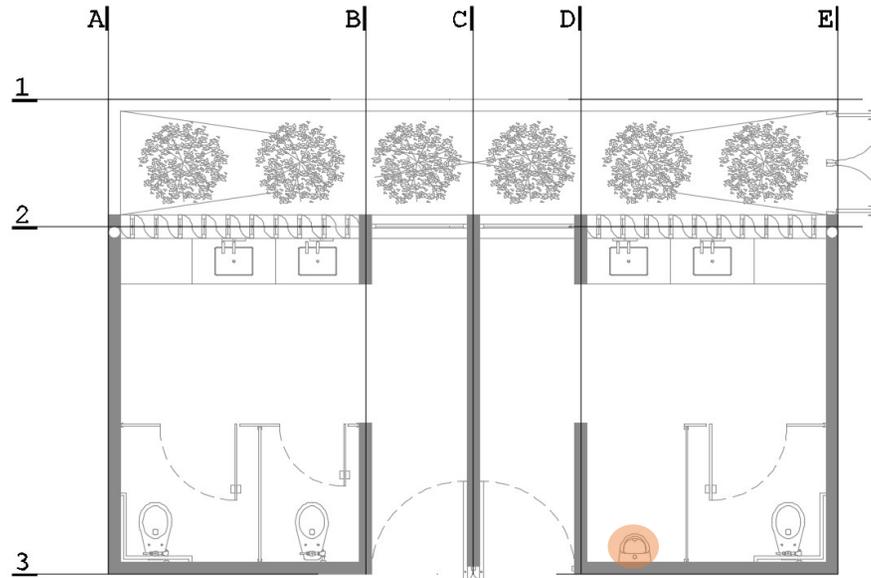


PARTIDA 08: MUEBLES DE BAÑO												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
47	Suministro y colocación de Fluxómetro para mingitorio marca SLOAN, modelo G2 8186-0.5. Incluye: materiales, mano de obra, herramienro, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					1	1	1.00	

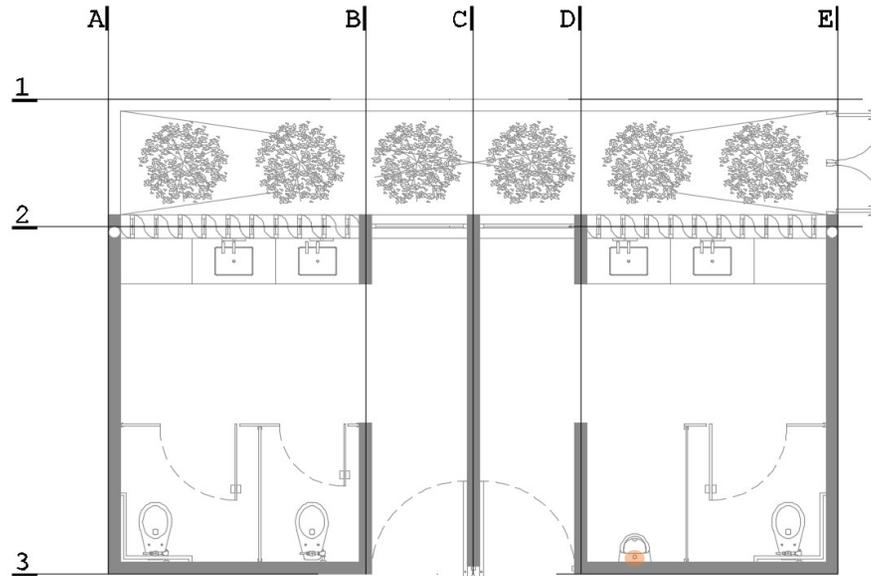


PARTIDA 08: MUEBLES DE BAÑO												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
48	Suministro y colocación de Llave por sensor y dispensador de jabón marca SLOAN, modelo ESD-500 . Incluye: materiales, mano de obra, herramienro, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					4	4	4.00	

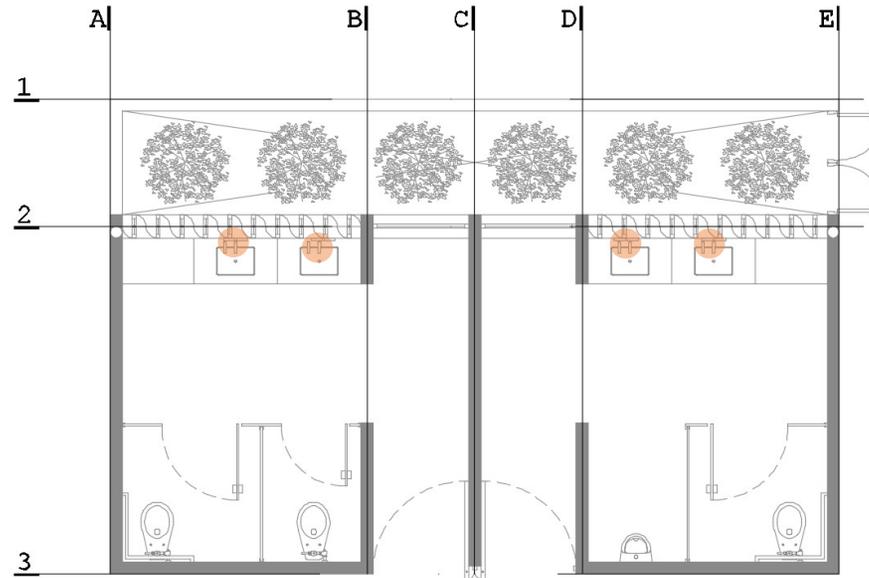


PARTIDA 08: MUEBLES DE BAÑO												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
49	Suministro y colocación de Lavabo de empotrar en barra marca Kohler, color blanco. Incluye: materiales, mano de obra, herramienro, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					4	4	4.00	

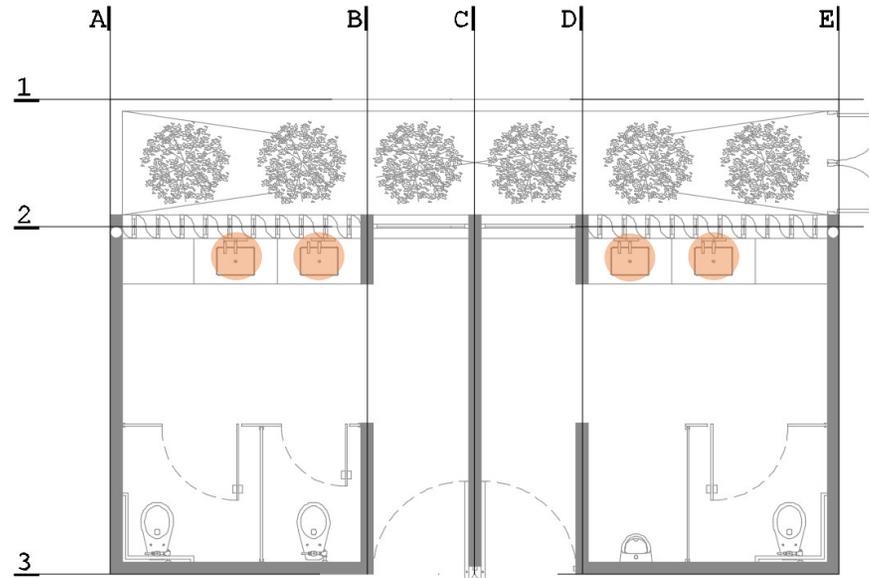


PARTIDA 08: MUEBLES DE BAÑO												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
50	Suministro y colocación de coladera mod. 24 mca. Helvex(para registro). Incluye: mano de obra y materiales requeridos, acarreo dentro de la obra, fletes, conexiones, elevaciones a cualquier altura, pruebas de funcionamiento, equipo y herramienta necesaria para la correcta ejecución del trabajo, limpiezas, trabajo terminado	PZA	A-E	1-3					2	2	2.00	

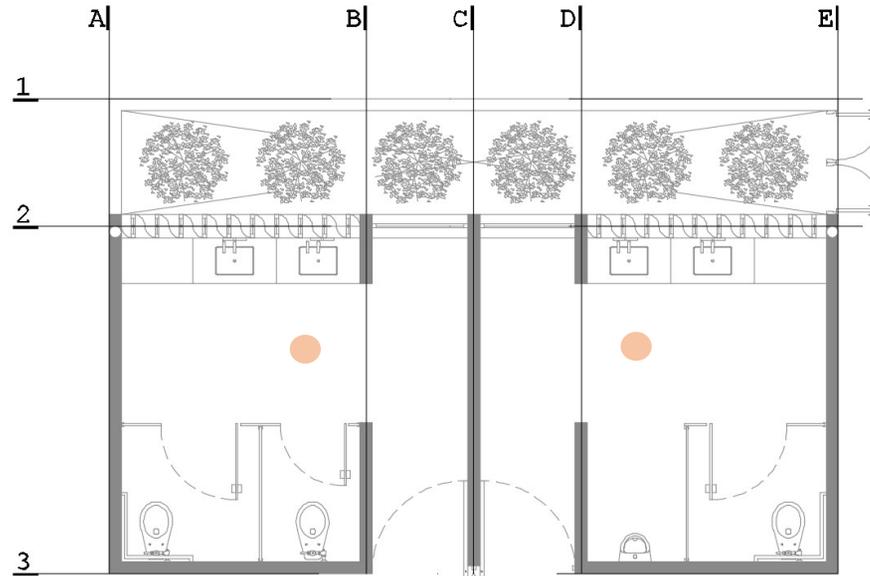


PARTIDA 09: COMPLEMENTOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
51	Suministro y colocación de Cancel de aluminio anodizado negro, con bisagra de pivote con cristal claro de 3mm. Medidas 0.30x2.2. mts. Incluye: materiales, mano de obra, herramienro, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					20	20	20.00	

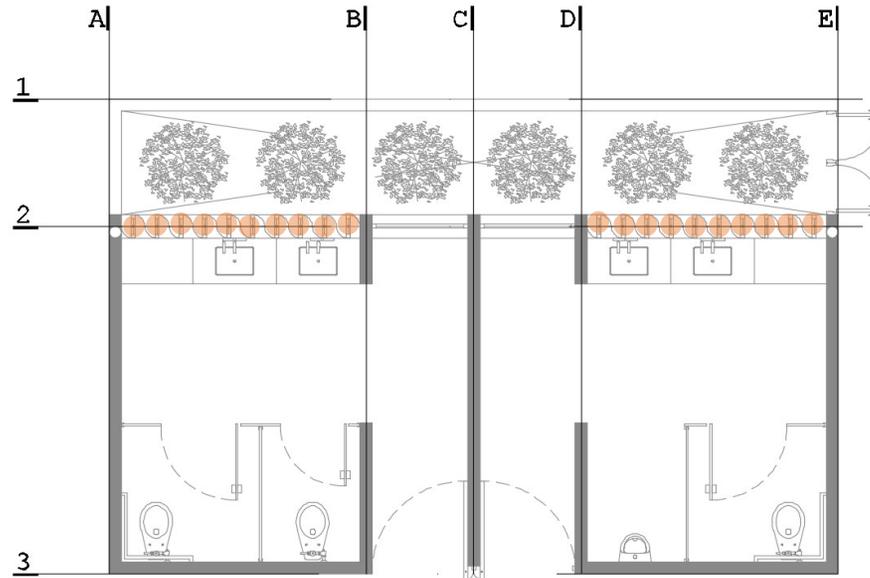


PARTIDA 09: COMPLEMENTOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
52	Suministro y colocación de Cancel de aluminio anodizado negro fijo con cristal claro de 3 mm. Medidas 1.20x3.10 mts. Incluye: materiales, mano de obra, herramienro, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					2	2	2.00	

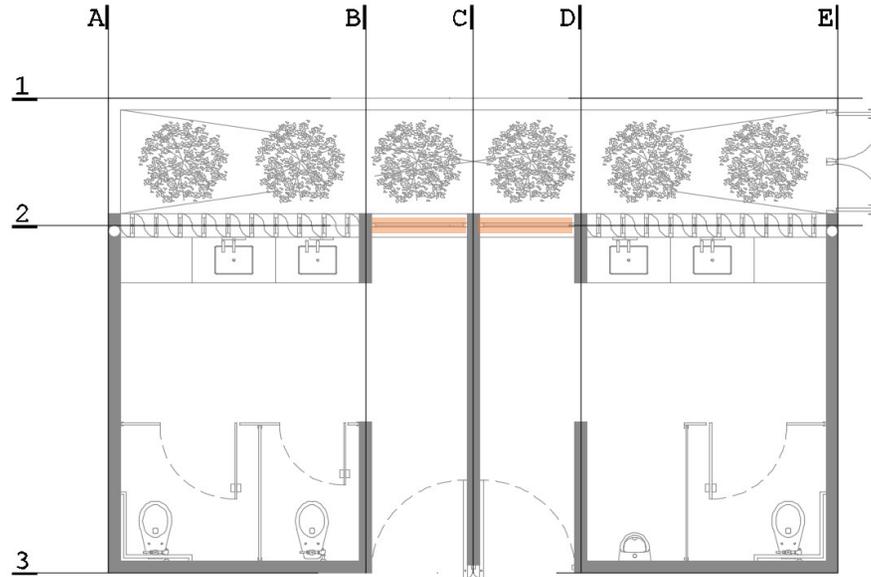


PARTIDA 09: COMPLEMENTOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
53	Suministro y colocación de herrería Espejo colgado a base de herrería, soportado en losa. Medidas 0.30x1.90 mts. Incluye: materiales, mano de obra, herramienro, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					4	4	4.00	

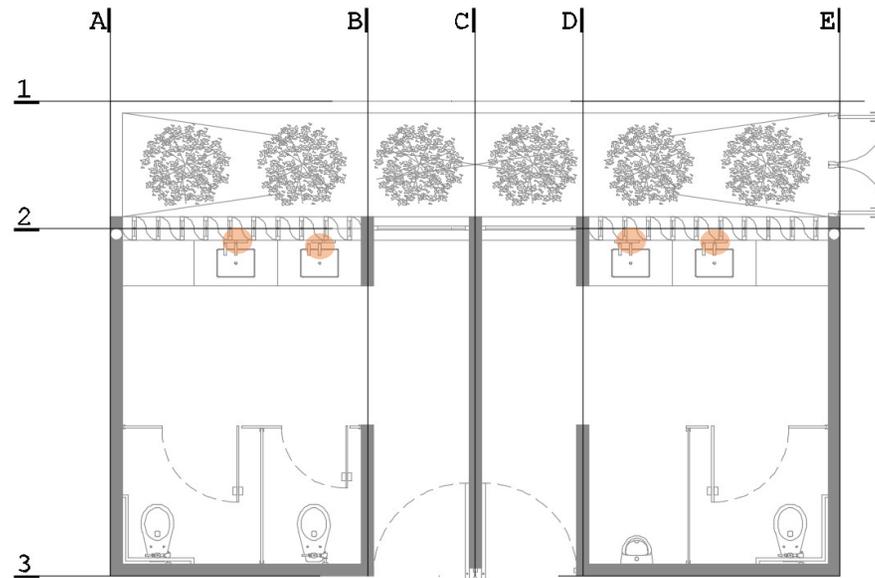


PARTIDA 09: COMPLEMENTOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
54	Suministro y colocación de Muble de baño de madera de encino natural, con cubierta de granito de 5 cms, para soportar lavabo. Incluye: materiales, mano de obra, herramienro, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					2	2	2.00	

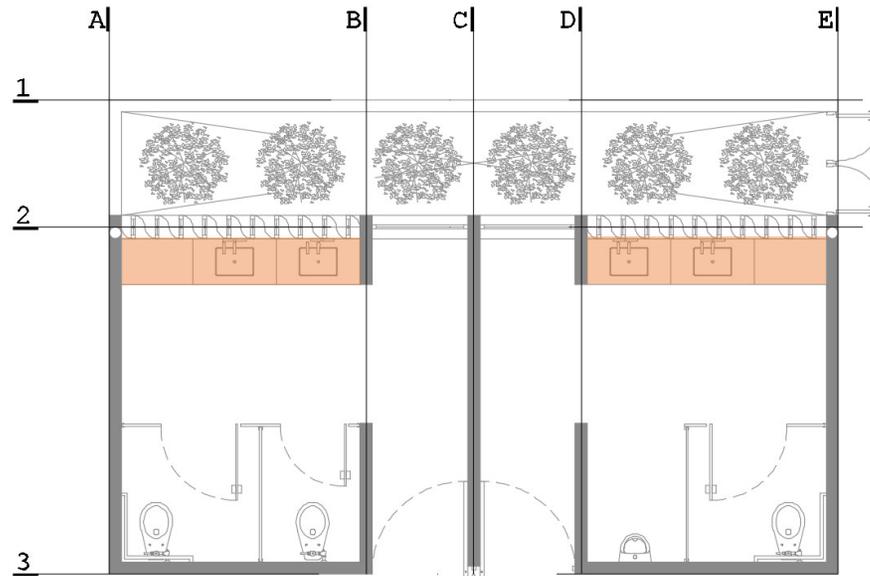


PARTIDA 09: COMPLEMENTOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
55	Suministro y colocación de Puerta de pivote de encino sólido, con bisagras de pivote, abatimiento izquierdo o dderecho según convenga. Medidas 1.27x3.10 mts. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					2	2	2.00	

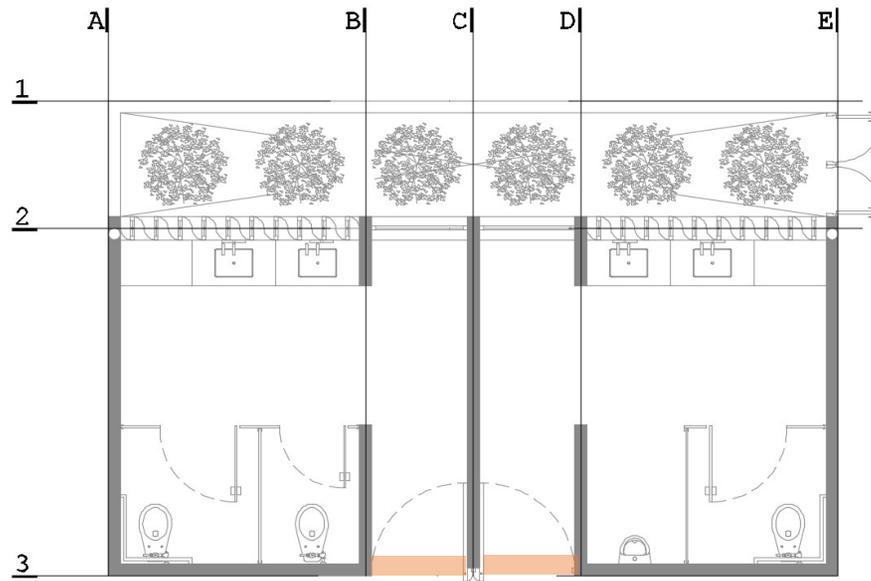


PARTIDA 09: COMPLEMENTOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
56	Suministro y colocación de Puerta de herrería abatimiento doble, acabado en pintura negra. Medidas 1.35x2.15 mts. Incluye: materiales, mano de obra, herramienro, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					1	1	1.00	

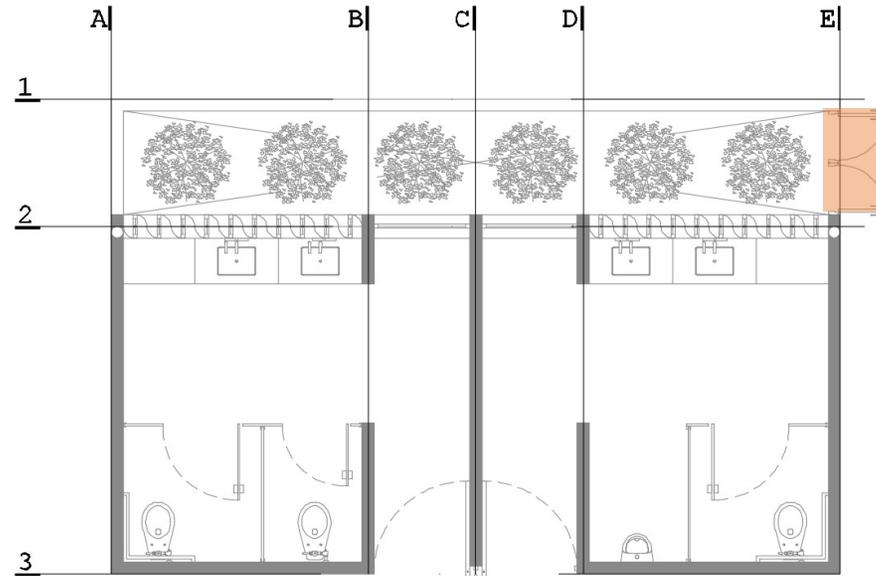


PARTIDA 10: ACCESORIOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
57	Suministro y colocación de Dispensado de papel Higiénico marca SANILOCK, modelo 7398-2. Incluye: materiales, mano de obra, herramienro, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					3	3	3.00	

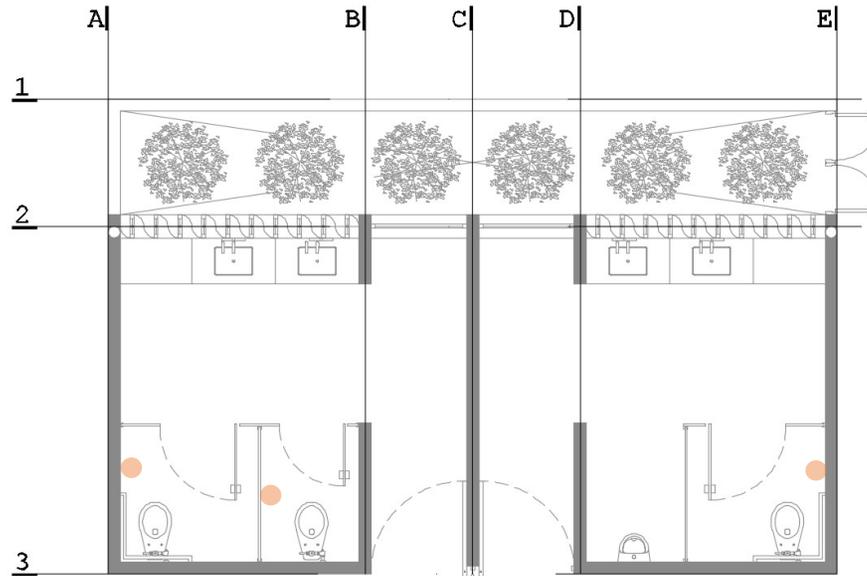


PARTIDA 10: ACCESORIOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
58	Suicidio y colocación de Dipensador de papel marca Alpine industries, Acabado imitación madera modelo C-fold. Incluye: materiales, mano de obra, herramienro, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					4	4	4.00	

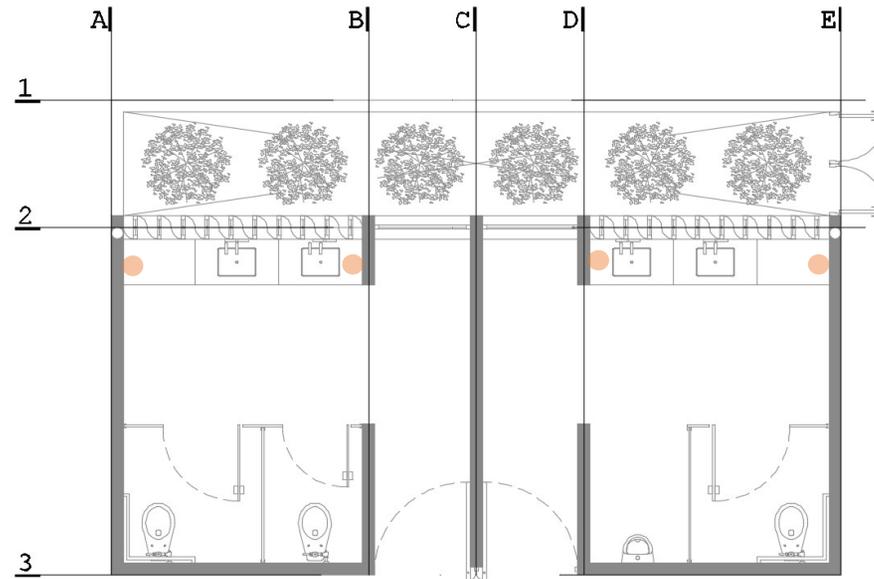


PARTIDA 10: ACCESORIOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
59	Suministro y colocación de Mampara marca SANILOCK, modelo estandar en acabado de acero inoxidable. Incluye: materiales, mano de obra, herramienro, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					2	2	2.00	

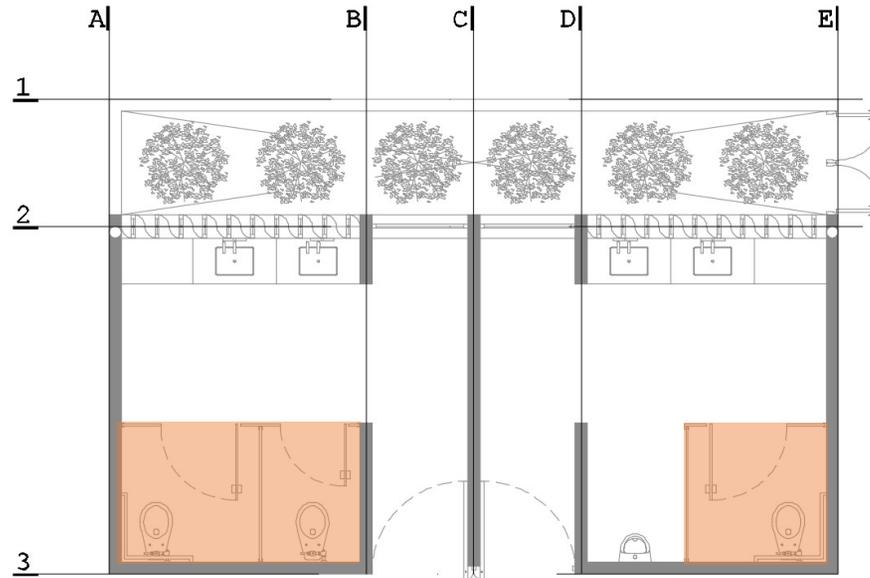


PARTIDA 10: ACCESORIOS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
60	Suministro y colocación de Barra de seguridad marca Kohler de 24", modelo K-14562. Incluye: materiales, mano de obra, herramienro, fijación, sellado y limpieza.	PZA	A-E	1-3					2	2	2.00	

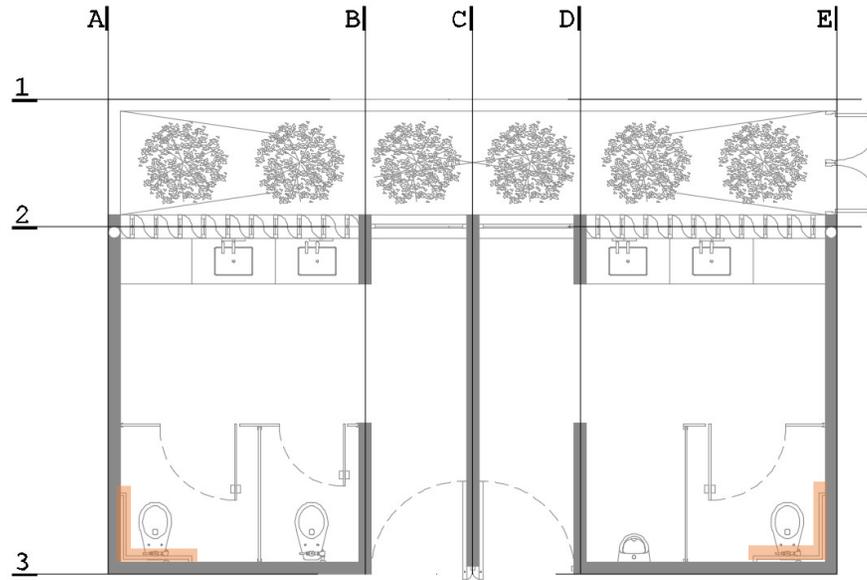


PARTIDA 11: JARDINERÍA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
61	Suministro y aplicación de Grava blanca como abacado final en todo el jardín exterior. Incluye desperdicios, fletes, acarreo hasta el lugar de la obra, maniobras de elevación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	M2	A-E	1-2	8.85	1.35		11.95		11.95	11.95	

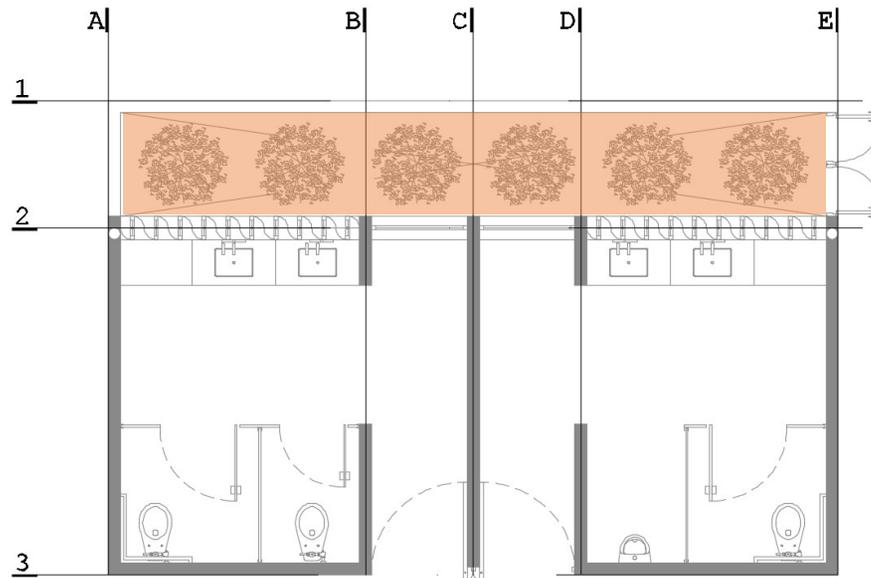


PARTIDA 11: JARDINERÍA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
62	Suinstru y plantación de Enredaderas para muro de jardín. Incluye desperdicios, fletes, acarreo hasta el lugar de la obra, maniobras de elevación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	A-E	1-2					28	28.00	28.00	

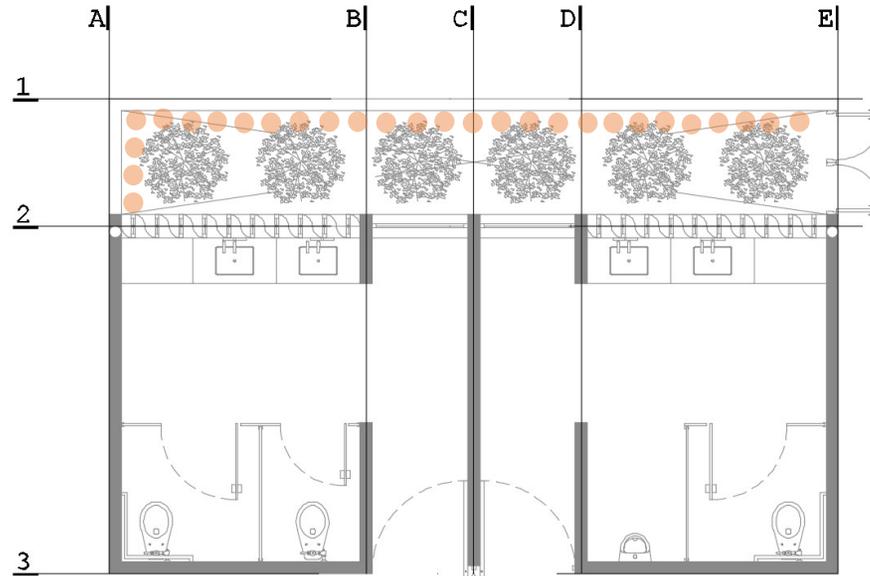


PARTIDA 11: JARDINERÍA												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
63	Suministro y plantación de Palmas de baja altura en jardín interior. Incluye fletes, acarreo hasta el lugar de la obra, maniobras de elevación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	PZA	A-E	1-2					6	6.00	6.00	

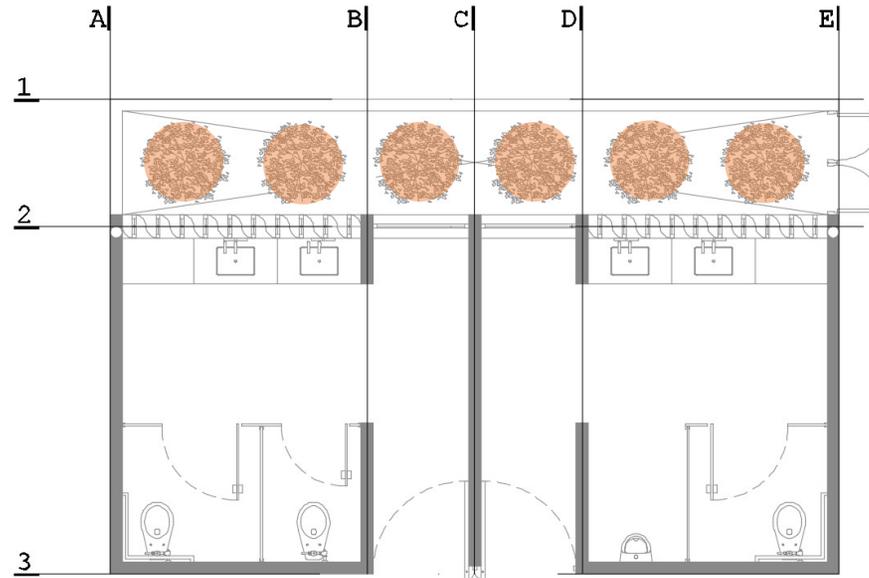


PARTIDA 12: AZOTEAS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
64	Pretel a base de de tabique de barro rojo recocido 7x14x28, asentado con mortero cemento-arena 1:3, juntas de 1.5cm de espesor, acabado común, hasta una altura de 3.5mts. Incluye acarreo de materiales, mano de obra, herramiento y equipo necesario.	M2										
64.1		M2	A	2-3	4.2		0.30	1.26		1.26	7.65	
64.2		M2	E	2-3	4.2		0.30	1.26		1.26		
64.3		M2	2	A-E	8.55		0.30	2.57		2.57		
64.4		M2	3	A-E	8.55		0.30	2.57		2.57		

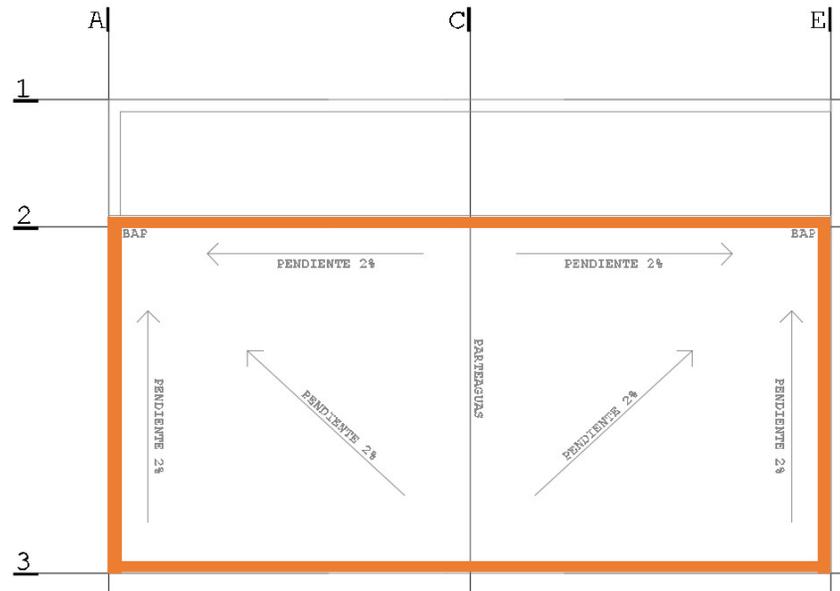


PARTIDA 12: AZOTEAS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
65	Castillo "K1" de sección 15x15, concreto $f'c=150\text{kg/cm}$ , TMA 3/4", reforzado con armex 15x15-4, cimbrado acabado común tres caras. Incluye acarreo de materiales a primera estación a 20mts de distancia	ML										
65.1		M2	A	1-3			0.30		3	0.90	3.60	
65.2		M2	E	1-3			0.30		3	0.90		
65.3		M2	1	A-E			0.30		2	0.60		
65.4		M2	2	A-E			0.30		2	0.60		
65.5		M2	3	A-E			0.30		2	0.60		

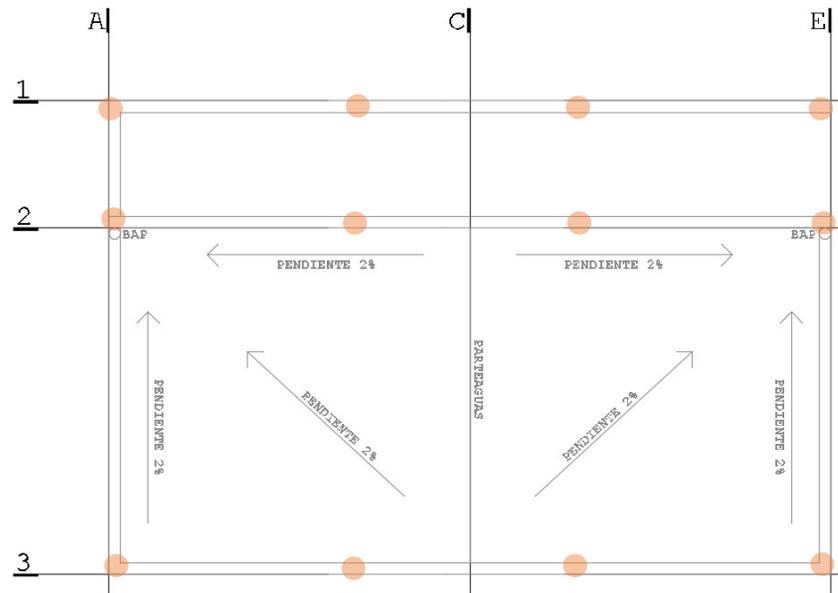


PARTIDA 12: AZOTEAS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
66	Relleno en Azotea a Base de Tepetate de Banco y Pison de Mano para dar Pendientes. Incluye: Elevacion de materiales, Humedecido, Tendido e Hilos, Limpiezas	M2	A-E	2-3	8.85	4.35		38.50		38.50	38.50	

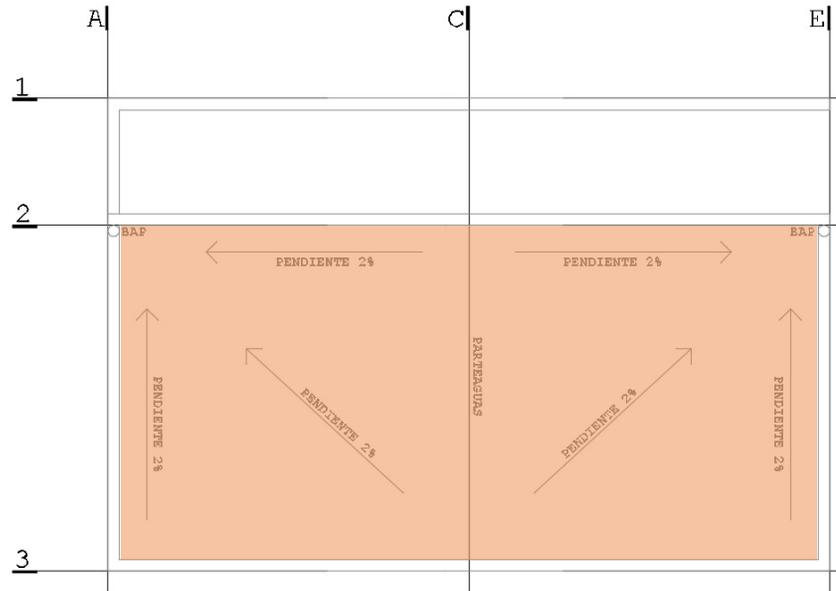


PARTIDA 12: AZOTEAS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
67	Entortado en Azotea con Mortero Cemento-Cal-Arena 1:2:6 de 2cm Esp. Incluye: Elevacion de Materiales, Tendido, Regleado y Terminado para Recibir Enladrillado, Limpiezas	M2	A-E	2-3	8.85	4.35		38.50		38.50	38.50	

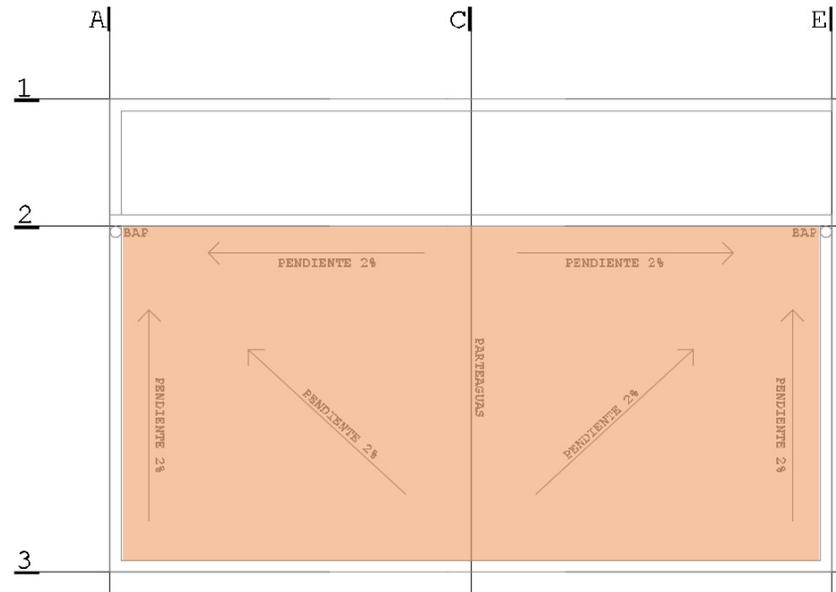


PARTIDA 12: AZOTEAS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
68	Enladrillado en Azotea con Ladrillo de Barro Comun de 1.50x12.50x23.5cm Acabado en Petatillo, Asentado con Mortero Cemento-Cal-Arena 1:2:6 Incluye: Nivelado, Terminado Final Chalpaque con Cemento Gris-Agua, Acarreos Dentro de La Obra, Elevaciones,	M2	A-E	2-3	8.85	4.35		38.50		38.50	38.50	

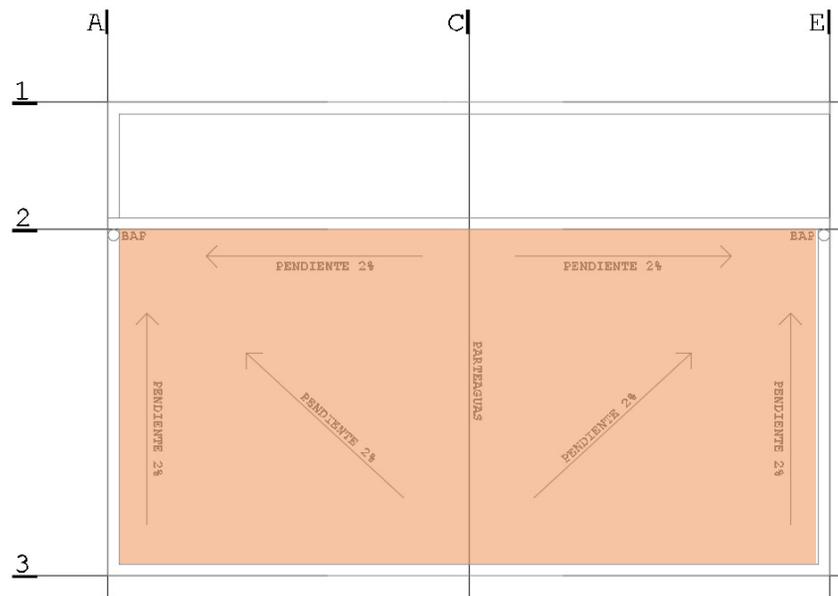


PARTIDA 12: AZOTEAS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
69	Chafal en Azotea a Base de Mortero Cemento-Cal-Arena 1:2:6 de 10x10 en forma Triangular. Incluye: Alineado, Elevacion de Materiales, Limpiezas	ML										
69.1		ML	A	2-3	4.35					4.35	26.40	
69.2		ML	E	2-3	4.35					4.35		
69.3		ML	2	A-E	8.85					8.85		
69.4		ML	3	A-E	8.85					8.85		

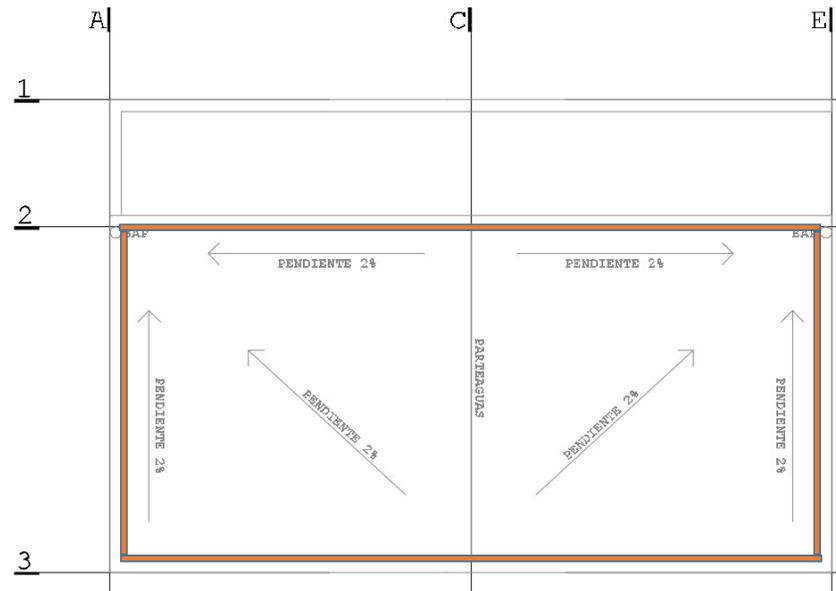


PARTIDA 12: AZOTEAS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
70	Impermeabilización Azotea sobre Enladrillado, Pretiles, Parte Superior de Pretiles, Juntas Frías y Chaflanes c/Impermeabilizante Elastomérico Color Blanco Mca BEREL Kover Cryl 5 años garantía. Incluye: Membrana, Instalaciones Especiales, Preparación de la Superficie, Primario, Aplicado con Cepillo de Ixtle y/o Rodillo para su correcta aplicación y distribución de M2xLITRO a 2 manos, Trabajo terminado, limpieza.	M2	A-E	2-3	8.85	4.35		38.50		38.50	38.50	

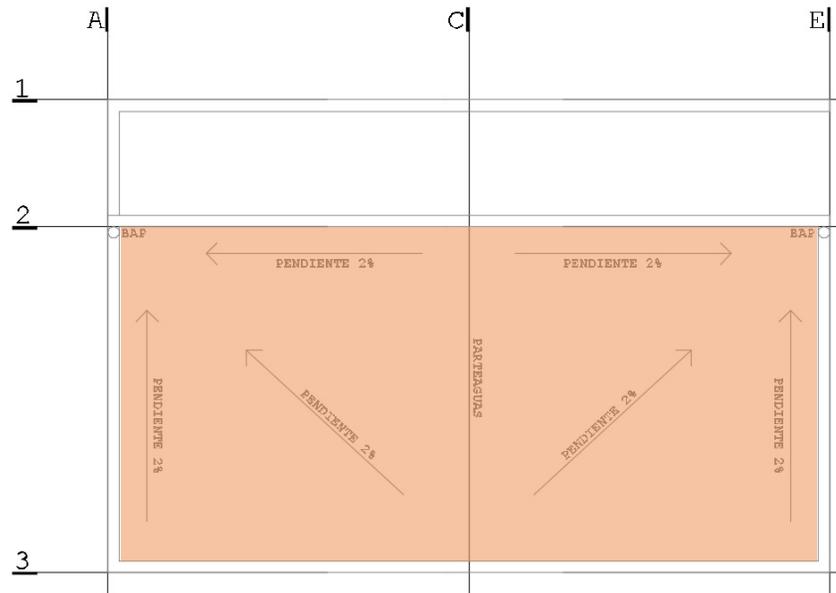

PARTIDA 12: AZOTEAS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
71	Aplanado fino en pretilos de mezcla de mortero de cemento-arena proporción 1:3 de 2cm de espesor, para recibir pintura. Incluye humedecido del area hasta 6m de altura, filos y boquillas, goterones, remates en pretilos, metal desplegado cal. 600 en áreas de concreto, trabajo terminado.	M2										
71.1		M2	A	2-3	4.35		0.30	1.31		1.31	7.92	
71.2		M2	E	2-3	4.35		0.30	1.31		1.31		
71.3		M2	2	A-E	8.85		0.30	2.66		2.66		
71.4		M2	3	A-E	8.85		0.30	2.66		2.66		

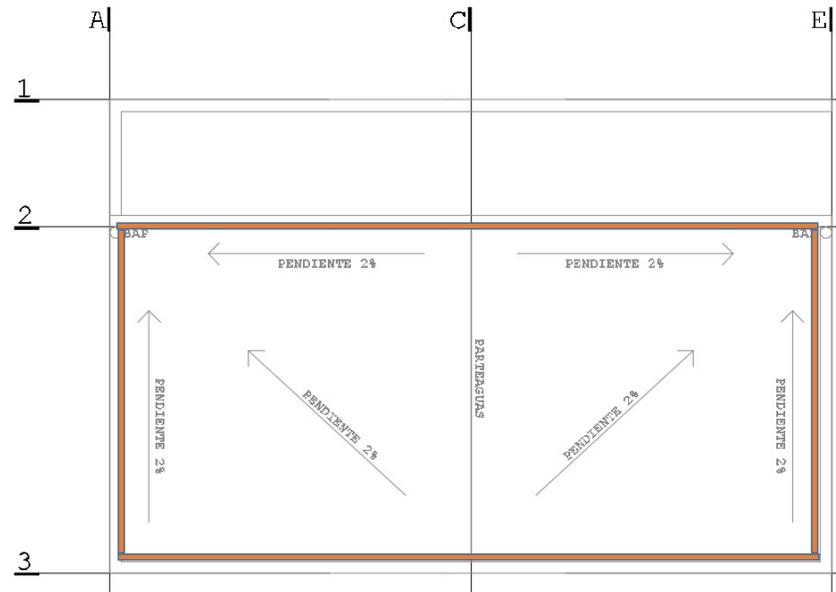

PARTIDA 12: AZOTEAS												
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
72	Suministro y aplicación en pretilos de pintura Blanca marca BEREL línea BERELINTE. Incluye una mano de sellador, dos manos de pintura, acarreo dentro de la obra, elevaciones, cualquier altura, protección de áreas adyacentes, limpiezas, trabajo terminado.	M2										
72.1		M2	A	2-3	4.35		0.30	1.31		1.31	7.92	
72.2		M2	E	2-3	4.35		0.30	1.31		1.31		
72.3		M2	2	A-E	8.85		0.30	2.66		2.66		
72.4		M2	3	A-E	8.85		0.30	2.66		2.66		

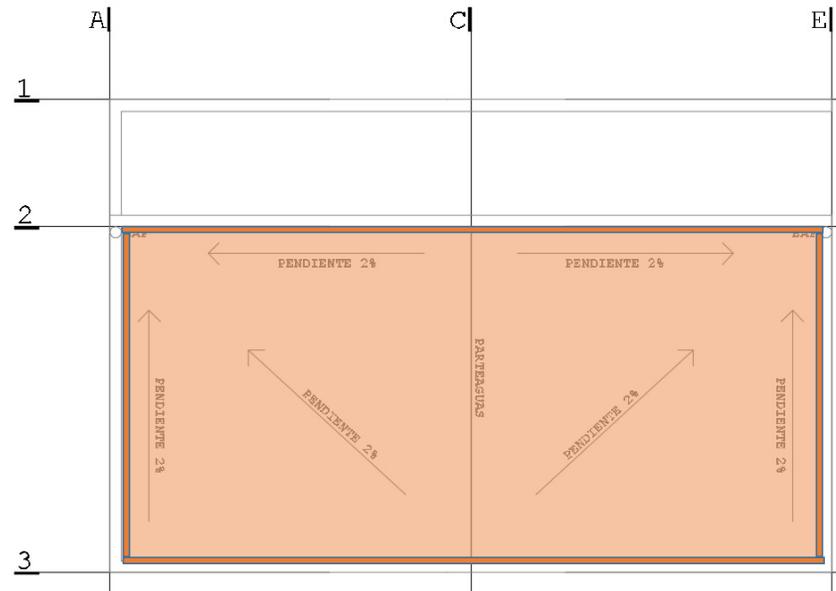

PARTIDA 13: LIMPIEZAS

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	LOCALIZACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	PZA	RESULTADOS		OBSERVACIONES
			EJE	ENTRE						PARCIAL	TOTAL	
73	Limpieza Gruesa de Obra. Incluye: Sacar Escombro a Tiradero Oficial, Acarreos Locales	M2	A-E	1 - 3	9.15	6.15		56.27		56.27	56.27	

74	Limpieza Final de Obra en Proyecto con solución de agua, detergente en polvo y ácido muriático. Incluye: Pisos, Vidrios, Herrería y Muebles Sanitarios.	M2	A-E	1 - 3	9.15	6.15		56.27		56.27	56.27	
----	---	----	-----	-------	------	------	--	-------	--	-------	-------	--

